

Informe:  
4to. Estado de Avance Programa Público de inversión Regional  
(PROPIR 2009)



# ARICA Y PARINACOTA

G O B I E R N O R E G I O N A L

DIVISION DE PLANIFICACION  
Y DESARROLLO REGIONAL

División de Planificación y Desarrollo Regional  
General Velásquez n° 1775, 2do Piso Edif. Norte  
(058) 207 398

El Informe detalla el estado de avance de la inversión F.N.D.R. y Sectorial llevado a cabo en la región, identificando la solicitud de recursos y gastos realizados al termino del año 2009.

## INDICE

1- Antecedentes Generales.....	2
1.1. Identificación de fechas claves.....	2
2.- Análisis de la Inversión Regional Solicitada para el año 2009.....	2
3.- Análisis de Avance 4to. Trimestre Inversión Regional por Fuente de Financiamiento (PROPIR 2009).....	5
3.1. Nivel de Ejecución Presupuestaria Fuente Sectorial 4to. Trimestre año 2009.....	5
3.1.1. Nivel de Avance Prog. 4to. Trim. 2009 fuente Sectorial por Ss. Resp.....	8
3.1.2.- Identificación de Iniciativas de Inversión relevantes con Fuente Sectorial.....	10
3.1.3. Nivel de Evolución de la Ejecución Presupuestaria 4to. Trim. 2009.....	12
3.2. Nivel de Ejecución Presupuestaria Fuente F.N.D.R. 4to. Trimestre año 2009.....	14
3.2.1. Nivel de Ejecución Presupuestaria 4to. Trim. año 2009.....	14
3.2.2. Nivel de Avance de la Prog. 2009 con fuente F.N.D.R. por U. Técnica.....	15
3.2.3.- Identificación de Iniciativas de Inversión relevantes con Fuente F.N.D.R. ....	18
3.2.4. Nivel de Inversión F.N.D.R. por Sector Económico.....	21
3.2.5. Nivel de Evolución de la Ejecución Presupuestaria 4to. Trim. 2009.....	23
4.- Conclusiones.....	25
Anexos.....	27
Anexo 1: Detalle avance iniciativas de inversión pública fuente Sectorial por Servicio Responsable al 4to. Trimestre, PROPIR 2009.	
Anexo 2: Detalle avance iniciativas de inversión pública fuente F.N.D.R. por Unidad Técnica al 4to. Trimestre, PROPIR 2009.	

## 1.- Antecedentes Generales

El presente documento expone el 4to. Informe de Estado de Avance de la Inversión Regional de Arica y Parinacota correspondiente al total del año 2009, identificándose los niveles de Inversión Sectorial y de F.N.D.R. para un total de 45 servicios públicos informantes, quienes utilizan el Sistema de Gestión de Inversión en línea ([www.vision.cl/arica](http://www.vision.cl/arica)) en adelante Chileindica, herramienta que surge a partir de la experiencia de la implementación del Sistema de Gestión mencionado y que se encuentra en la actualidad implementándose en el resto del país a nivel de Gobiernos Regionales, iniciativa apoyada por Subdere.

### 1.1.- Identificación de fechas claves

Mediante Of. Ord. (GORE) N° 003/09, con fecha 05 de enero del 2009 el Sr. Intendente informo a las SEREMIAS y Servicios Públicos sobre modalidad de entrega de información para elaboración de los Estados de Avance PROPIR 2009, la que debe ser realizada a través del Sistema de Gestión de Inversión dispuesto en la web ([www.vision.cl/arica](http://www.vision.cl/arica)).

Junto con ello, se establece que los servicios podrán cargar la información en el sistema hasta el 5° día hábil del mes siguiente a la fecha de entrega establecida, considerándose entonces la información registrada en el portal la oficial del servicio informante.

## 2.- Análisis de la Inversión Regional Solicitada para el año 2009<sup>1</sup>.

Para efectos del presente informe, al igual que los anteriores, solo se consideran las iniciativas y montos correspondientes a la fuente Sectorial, Sectorial (Social) y FNDR en base a los recursos solicitados<sup>2</sup>, a objeto de facilitar su comprensión y análisis.

La tabla n° 1 identifica el nivel de participación en la inversión por fuente de financiamiento, actualizada al 4to Trimestre 2009, la cual refleja que del total de recursos solicitados al 31 de Dic., un 47,3% corresponde a inversión sectorial (social) la que incluye aquellas iniciativas consideradas en el ámbito social como los programas de becas, subsidios y pensiones (JUNAEB, SERVIU, IPS, SERPLAC, CONADI, SENAMA), en segundo lugar encontramos la inversión sectorial con un 35,6% que dice relación con aquellas iniciativas del sector que se enfocan en programas, estudios y proyectos, y finalmente la inversión solicitada al F.N.D.R. con un 17,1% del total de Inversión Regional.

<sup>1</sup> Para mayor detalle sobre inversiones ver Informe: Programa Público de Inversión Regional 2009.

<sup>2</sup> Los recursos solicitados 2009 dicen relación con el monto de inversión que según programación se llevará a cabo en el presente año, pudiendo representar el total o un porcentaje del costo total de la inversión informada por el servicio. Cabe señalar que el avance en la programación siempre estará sujeto a variables como fechas de aprobación de iniciativas, fechas de asignación de recursos, fechas de licitación, apertura y adjudicación de las licitaciones relacionadas con la inversión, por lo tanto puede ser identificado como un factor de medición para el avance de la inversión en una etapa específica, pero no como un factor de medición de la eficiencia, en este último caso parece ser que el dato Asignación/Gasto representa un mejor criterio para evaluar dicho índice.

En el caso del F.N.D.R, al igual que para los Estados de Avance anteriores el análisis se ha trabajado en base al total de recursos solicitados 2009 en las iniciativas aprobadas por el CORE, a la fecha del informe, o sea según su programación requieren dicha cantidad de recursos para su ejecución en el presente año, sin embargo se deben considerar algunos aspectos relevantes en este sentido<sup>3</sup>.

Tabla n° 1: Identificación Fuente de Financiamiento Sectorial y FNDR año 2009

Fuente Financiamiento	Cantidad de Iniciativas	Solicitado año 2009	Porcentaje Part.
Fndr	191	18.573.898.471	17,1%
Sectorial	213	38.754.033.197	35,6%
Sectorial(Social)	84	51.393.674.414	47,3%
<b>Total general</b>	<b>488</b>	<b>108.721.606.082</b>	<b>100,0%</b>

Fuente: Elaboración DIPLAN-GORE, en base al PROPIR Sectorial y FNDR 2009(S.G.I.)

La tabla n° 2 detalla la inversión pública a llevar a cabo por cada servicio responsable y/o unidad técnica, según fuente de financiamiento: F.N.D.R., Sectorial, Sectorial (Social) y con su correspondiente nivel de participación por Servicio.

Tabla n° 2: Inversión pública con solicitud año 2009 por servicio responsable y/o unidad técnica.

N°	Servicio Responsable / Unidad Técnica	Fuente Financiamiento			Total general	% Partic. Total Solicitado
		Fndr	Sectorial	Sectorial(Social)		
1	Instituto de Previsión Social			27.906.624.000	27.906.624.000	25,67%
2	Servicio de Vivienda y Urbanización	1.455.000	2.594.884.000	16.259.311.000	18.855.650.000	17,34%
3	Servicio de Salud	640.291.026	10.209.038.000		10.849.329.026	9,98%
4	Dirección Vialidad	3.620.008.531	6.054.548.409		9.674.556.940	8,90%
5	Junta Nac. de Auxilio Escolar y Becas			6.772.963.045	6.772.963.045	6,23%
6	Instituto Nacional del Deporte	37.710.036	4.475.496.000		4.513.206.036	4,15%
7	Gobierno Regional	4.050.122.707			4.050.122.707	3,73%
8	Dirección de Arquitectura	1.576.853.326	1.832.961.466		3.409.814.792	3,14%
9	I. Municipalidad de Arica	2.810.648.981			2.810.648.981	2,59%
10	Servicio Nac. de Capacitación y Empleo		2.643.849.238		2.643.849.238	2,43%
11	Seremi de Vivienda y Urbanismo	2.459.176.235			2.459.176.235	2,26%

<sup>3</sup> Para el detalle de los factores considerados en el análisis de la inversión con fuente de financiamiento F.N.D.R. Ver Primer Informe Avance Programa Público de Inversión Regional 2009 (PROPIR),

12	Dirección de Obras Hidráulicas	261.613.065	2.176.964.440		2.438.577.505	2,24%
13	Instituto de Desarrollo Agropecuario		1.669.300.905		1.669.300.905	1,54%
14	Servicio Nacional de Menores	2.945.800	1.459.817.000		1.462.762.800	1,35%
15	Corp. de Fomento de la Producción		1.282.483.769		1.282.483.769	1,18%
16	Dirección Obras Portuarias	23.438.000	1.012.373.360		1.035.811.360	0,95%
17	Comisión Nac. de Desarrollo indígena		703.000.000	147.000.000	850.000.000	0,78%
18	Subsecretaría de Trabajo	846.258.000			846.258.000	0,78%
19	Servicio Nacional de Turismo	539.060.000	19.973.610		559.033.610	0,51%
20	Seremi de Educación		507.754.137		507.754.137	0,47%
21	Servicio de Cooperación Técnica		505.660.000		505.660.000	0,47%
22	I. Municipalidad de Camarones	401.795.008			401.795.008	0,37%
23	I. Municipalidad de Gral Lagos	394.320.373			394.320.373	0,36%
24	Fondo Nac. ayuda a los discapacitados		357.943.376		357.943.376	0,33%
25	Consejo Nac. de la Cultura y las Artes		303.581.440		303.581.440	0,28%
26	Carabineros de Chile	263.954.000			263.954.000	0,24%
27	Seremi de Salud	650.000	236.309.275		236.959.275	0,22%
28	Seremi de Planificación			230.535.045	230.535.045	0,21%
29	I. Municipalidad de Putre	227.353.809			227.353.809	0,21%
30	Gendarmería de Chile, Dir. Regional	15.250.000	190.737.000		205.987.000	0,19%
31	Junta Nacional de Jardines Infantiles	157.426.803			157.426.803	0,14%
32	Servicio Nacional de la Mujer		133.085.662		133.085.662	0,12%
33	Universidad de Tarapacá	128.968.352			128.968.352	0,12%
34	Servicio Agrícola y Ganadero		120.820.411		120.820.411	0,11%
35	Secretaría de Transporte		103.362.000		103.362.000	0,10%
36	Servicio Nacional del Adulto Mayor			77.241.324	77.241.324	0,07%
37	Corporación Nacional Forestal	12.472.000	54.537.000		67.009.000	0,06%
38	Comisión Nacional del Medio Ambiente	33.864.000	29.550.000		63.414.000	0,06%
39	Policía de Investigaciones	37.142.000			37.142.000	0,03%
40	Seremi de Minera		32.582.411		32.582.411	0,03%
41	Dirección General de Aguas		30.000.000		30.000.000	0,03%
42	Fundación Integra	17.889.419			17.889.419	0,02%
43	Dir. de Promoción de Exportaciones		13.420.288		13.420.288	0,01%
44	Subsecretaría de Desarrollo Regional	12.800.000			12.800.000	0,01%
45	Servicio Nacional de Aduanas	432.000			432.000	0,00%
<b>Total general</b>		<b>18.573.898.471</b>	<b>38.754.033.197</b>	<b>51.393.674.414</b>	<b>108.721.606.082</b>	<b>100,00%</b>
<b>Part. Fuente de Financiamiento</b>		<b>17,1%</b>	<b>35,6%</b>	<b>47,3%</b>	<b>100,0%</b>	

Fuente: Elaboración DIPLAN-GORE, en base al PROPIR Sectorial y FNDR 2009(S.G.I.)

### 3.- Análisis de Avance 4to. Trimestre Inversión Regional por Fuente de Financiamiento (PROPIR 2009)

Para efectos de comprensión y análisis de la información proporcionada es preciso reiterar que la información utilizada para la elaboración del análisis de la inversión regional ha sido obtenida de la siguiente forma:

- La fuente de financiamiento Sectorial es otorgada por los servicios públicos a través sistema web de gestión de inversión, y
- La fuente de financiamiento vía F.N.D.R. es otorgada por el Gobierno Regional de Arica y Parinacota (DACOG).

En ambos casos, los antecedentes de las iniciativas de inversión son ingresados al Sistema de Gestión Integral denominado como Chileindica a partir del 3er Trimestre del presente año con la incorporación de los Gobiernos Regionales del país.

De esta forma, para efectos de análisis de la inversión se expondrán por separado los avances registrados según su fuente de financiamiento<sup>4</sup>.

#### 3.1.- Nivel de Ejecución Presupuestaria Fuente Sectorial 4to. Trimestre año 2009

En relación al número de iniciativas con financiamiento sectorial se observa que se produjo un aumento de 295 iniciativas informadas a 297, es decir 2 iniciativas más que las registradas al tercer informe de avance correspondiente al III Trimestre (Septiembre).

Entonces, acorde a lo informado por los sectores a Diciembre de 2009, el nivel de inversión sectorial solicitada para la región es de M\$ 90.147.707 a diferencia de lo informado durante el tercer trimestre (M\$100.968.208), esta cifra incorpora la inversión sectorial y la sectorial "social", esta última correspondiente a lo informado por la JUNAEB, IPS (ex I.N.P), CONADI y SERVIU, que hace referencia a los programas de becas, beneficios previsionales y subsidios habitacionales.

Cabe destacar que la inversión sectorial informada disminuyo en un 12 % aprox. durante el periodo de Sept. a Dic. 2009 lo que representa una disminución de M\$10.820.500.

La tabla n° 3 expone el nivel de inversión sectorial solicitada al 31 de Diciembre 2009, diferenciando entre la fuente sectorial y la inversión con carácter social, junto con ello se identifica el nivel de ejecución a la misma fecha.

<sup>4</sup> Ver Anexos detalle de Iniciativas de Inversión según fuente de financiamiento.

Tabla n° 3: Nivel de inversión Sectorial solicitado 2009 y gasto ejecutado al Cuarto Trimestre.


Fuente Financiamiento	Solicitado 2009 (1)	Inv. Ejecutada a Dic . 2009 (2)	Porcentaje Ejecución a Dic. 2009 (2/1)
Sectorial	38.754.033.197	30.334.119.678	78,3%
Sectorial(Social)	51.393.674.414	48.303.492.164	94,0%
<b>Total general</b>	<b>108.339.384.082</b>	<b>94.497.656.951</b>	<b>87,2%</b>

Fuente: Elaboración DIPLAN-GORE, en base a PROPIR 2009 Servicios Públicos (S.G.I.)

Obs.: (\*) Tabla n° 4 detalla los servicios y montos de inversión Sectorial (Social).

En relación al estado de avance en este cuarto trimestre, podemos señalar que la ejecución de recursos sectoriales registra un incremento del 31,2% con respecto al tercer trimestre.

Total de Inversión Sectorial Solicitada v/s Gasto efectuado al IV Trimestre año 2009

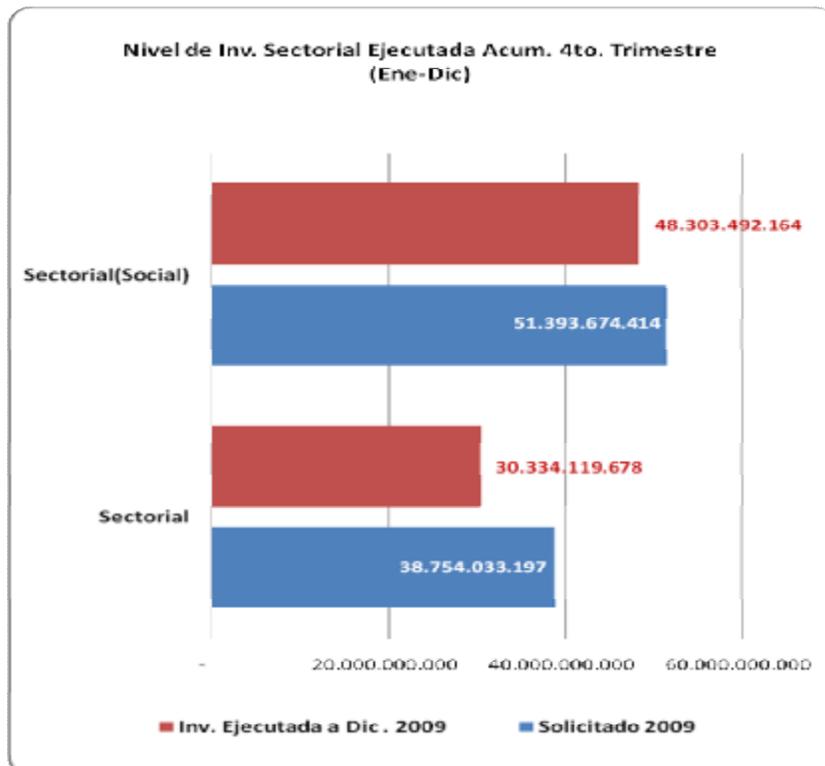

Gráficamente, se observa la diferencia entre los niveles de ejecución (gasto) de la inversión sectorial informado al término del 4to Trimestre mientras las iniciativas de inversión expresadas como: estudios, programas, proyectos con fuente SECTORIAL registran un avance de un 78,3% en relación a lo solicitado.

Por otra parte, la inversión SECTORIAL (Social) registra un avance de un 94,0% lo que responde a una ejecución programada que se llevo a cabo o fue informada al mes de diciembre de 2009.

Fuente: Elaboración DIPLAN-GORE, en base a PROPIR 2009 Servicios Públicos (S.G.I.)

De acuerdo a lo expuesto en tabla anterior, a continuación se detalla los servicios responsables que informaron inversión con fuente sectorial (Social)<sup>5</sup>:

Tabla n° 4: Servicios Responsables informan inversión Fuente Sectorial (Social) 2009 y gasto Ejecutado al Cuarto Trimestre.

Servicio Responsable	Solicitado año 2009 (1)	Inv. Ejecutada a Dic . 2009 (2)	Dif. por Ejecutar acorde a Programa 2009 (1-2)	Porcentaje Ejecución a Dic. 2009
CONADI	147.000.000	62.528.379	84.471.621	42,5%
IPS (Ex – INP)	27.906.624.000	27.396.615.649	510.008.351	98,2%
JUNAEB	6.772.963.045	6.628.001.767	144.961.278	97,9%
SERPLAC	230.535.045	230.535.045	-	100,0%
SERVIU	16.259.311.000	13.908.570.000	2.350.741.000	85,5%
SENAMA	77.241.324	77.241.324	-	100,0%
<b>Total general</b>	<b>51.393.674.414</b>	<b>48.303.492.164</b>	<b>3.090.182.250</b>	<b>94,0%</b>

Fuente: Elaboración DIPLAN-GORE, en base a PROPIR 2009 Servicios Públicos (S.G.I.)

De acuerdo a la información entregada por los servicios, podemos señalar que en términos generales se entre el tercer y cuarto trimestre se registra un incremento del 26% en la ejecución de la inversión sectorial (social) pasando de un 68% a un 94%.

<sup>5</sup> Para Mayor detalle revisar anexo Inversión Fuente Sectorial, donde se identifica iniciativas de inversión relacionados.

### 3.1.1.- Nivel de Avance de la Programación 4to. Trimestre 2009 Fuente Sectorial por Servicio Responsable

La tabla n°5 busca identificar el nivel de avance de los servicios, pero en base a la programación realizada para cada iniciativa, es decir, la base de cálculo es la solicitud 2009 (informada a Dic. 2009), en comparación con el gasto efectuado al término del 4to. Trimestre, según lo informado por cada servicio.


Tabla n° 5: Nivel de Avance del Prog. Fuente Sectorial (base programación ejecución 2009)

Unidad Técnica	Total Solicitado año 2009	Total Pagado o Inv. Ejecutada a Dic. 2009	Porcentaje Avance Ejecución a Dic. 2009
Servicio Nacional de Menores	1.459.817.000	1.491.636.881	102,2%
Corporación de Fomento de la Producción	1.282.483.769	1.282.483.769	100,0%
Dirección Obras Portuarias	1.012.373.360	1.012.373.360	100,0%
Seremi de Minera	32.582.411	32.582.411	100,0%
Seremi de Planificación	230.535.045	230.535.045	100,0%
Servicio Agrícola y Ganadero	120.820.411	120.820.411	100,0%
Servicio de Cooperación Técnica	505.660.000	505.660.000	100,0%
Servicio Nacional de la Mujer	133.085.662	133.085.662	100,0%
Servicio Nacional del Adulto Mayor	77.241.324	77.241.324	100,0%
Dirección General de Aguas	30.000.000	29.994.915	100,0%
Seremi de Salud	236.309.275	232.523.116	98,4%
Instituto de Previsión Social	27.906.624.000	27.396.615.649	98,2%
Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas	6.772.963.045	6.628.001.767	97,9%
Servicio Nacional de Capacitación y Empleo	2.643.849.238	2.535.290.469	95,9%
Dirección de Obras Hidráulicas	2.176.964.440	1.940.319.372	89,1%
Servicio de Salud	10.209.038.000	8.643.620.514	84,7%
Consejo Nacional de la Cultura y las Artes	303.581.440	248.786.199	82,0%
Servicio de Vivienda y Urbanización	18.854.195.000	15.101.530.236	80,1%
Dirección Vialidad	6.054.548.409	4.463.776.628	73,7%
Instituto de Desarrollo Agropecuario	1.669.300.905	1.192.763.101	71,5%
Comisión Nacional de Desarrollo indígena	850.000.000	606.978.379	71,4%
Dirección de Arquitectura	1.832.961.466	1.281.745.915	69,9%
Instituto Nacional del Deporte	4.475.496.000	2.953.907.312	66,0%
Comisión Nacional del Medio Ambiente	29.550.000	17.750.000	60,1%
Corporación Nacional Forestal	54.537.000	28.017.534	51,4%
Seremi de Educación	507.754.137	253.876.603	50,0%
Secretaría de Transporte	103.362.000	43.881.000	42,5%
Dirección de Promoción de Exportaciones	13.420.288	5.517.048	41,1%
Fondo Nacional de ayuda a los discapacitados	357.943.376	143.418.060	40,1%
Servicio Nacional de Turismo	19.973.610	2.879.162	14,4%
Gendarmería de Chile, Dirección Regional	190.737.000	-	0,0%
<b>Total general</b>	<b>90.147.707.611</b>	<b>78.637.611.842</b>	<b>87,2%</b>

Fuente: Elaboración DIPLAN-GORE, en base a PROPIR 2009 Servicios Públicos (S.G.I.)

El cuadro anterior contiene los porcentajes de avance en ejecución respecto del total solicitado por cada uno de los Servicios, en primera instancia este indicador suele parecer un instrumento de gestión sin embargo debe recordarse que existen servicios que si bien han ejecutado un alto porcentaje, poseen un nivel o monto de inversión menor a otros servicios por cuanto entonces, debemos fijarnos en los montos de inversión ejecutada o pagada.

La gráfica ilustra de mejor forma el nivel de avance de la programación 2009 por servicio, en color rojo los recursos efectivamente ejecutados al 4to. Trimestre del año (Dic.) y en color verde la cantidad de recursos sectorial que falta por ejecutar según programación 2009.

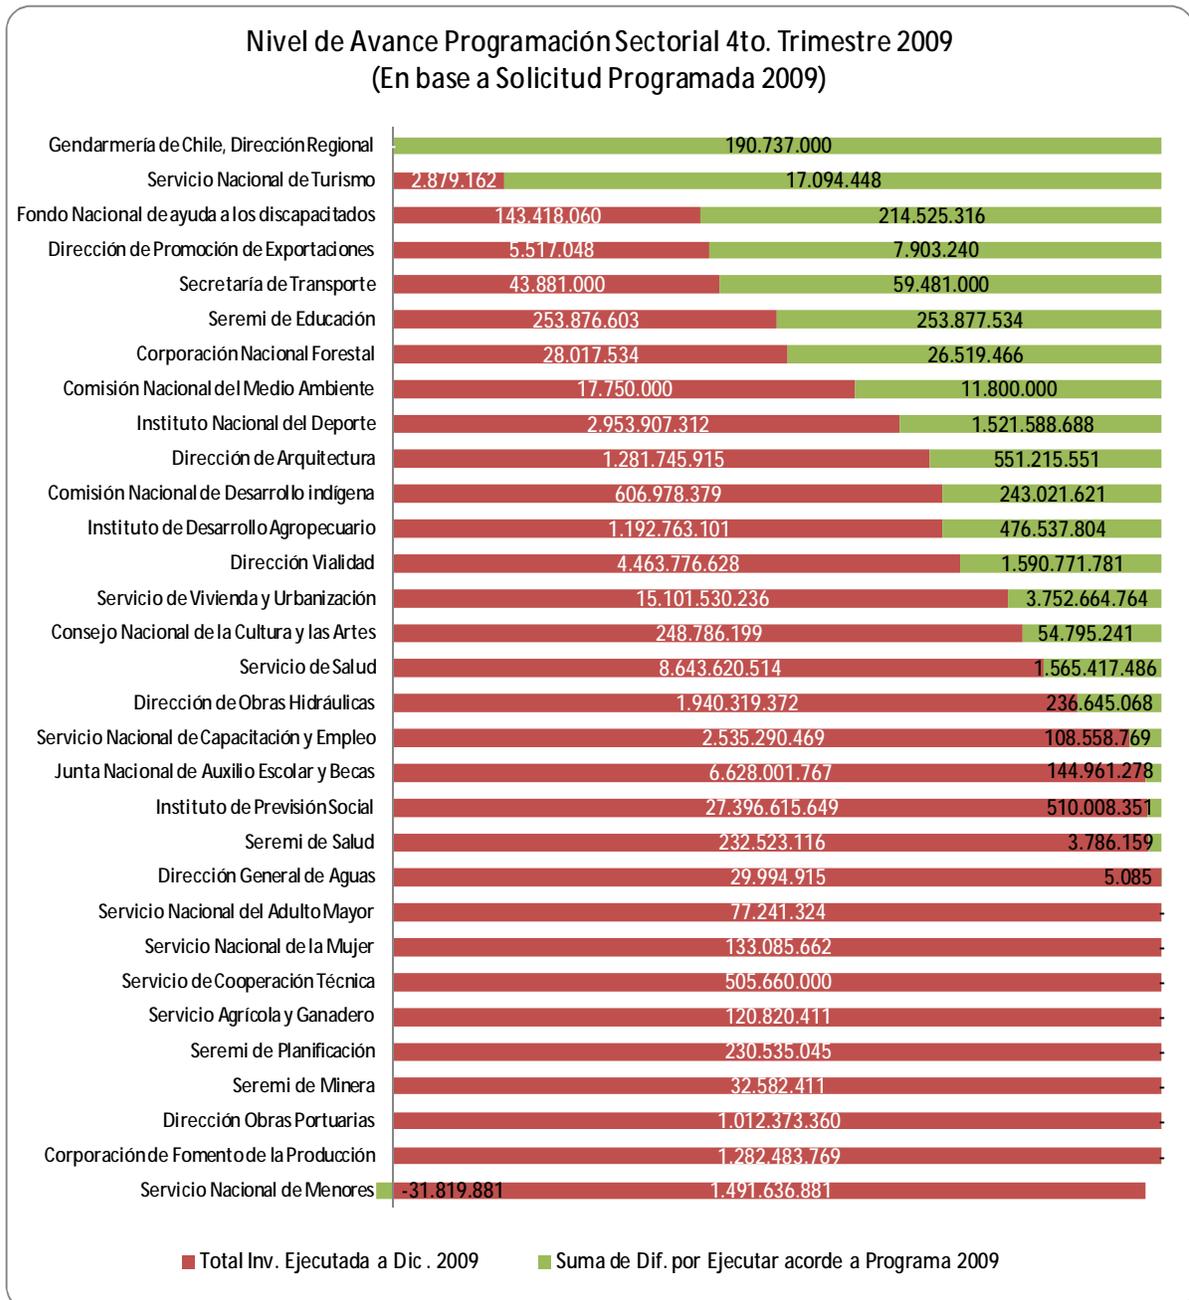

De acuerdo a lo anterior, es relevante considerar que solo el Instituto de Previsión Social (IPS) mas el Servicio de Vivienda y Urbanización (SERVIU) en forma conjunta han ejecutado el 54%(M\$42.498.145) del total de la ejecución de tipo sectorial a Diciembre de 2009 (M\$78.637.611), mostrando claramente el esfuerzo realizado en el ámbito social en beneficio de la región.

### 3.1.2.- Identificación de Iniciativas de Inversión relevantes con Fuente Sectorial

A continuación se identifican algunas iniciativas de inversión con fuente de financiamiento sectorial destacadas. La información fue entregada por los servicios:

- a) *Programa de Alimentación Escolar Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas Dirección Regional de Arica y Parinacota.*



El Programa de Alimentación Escolar tiene como finalidad entregar diariamente alimentación complementaria y diferenciada, durante el año lectivo, a estudiantes en condición de vulnerabilidad de los niveles de Educación Parvularia (Pre-Kínder y Kínder), Básica, Media y Universitaria de establecimientos Educacionales Municipales y Particulares Subvencionados, zona urbana y rural del país, con el objeto de mejorar su asistencia a clases y evitar la deserción escolar. El programa cubre tanto actividades curriculares como extra curriculares, durante el año lectivo y en vacaciones de invierno y verano.

La inversión correspondiente al Programa de Alimentación Escolar Proyección 2009 de la Región de Arica y Parinacota corresponde a 4.028.269(M\$) el cual es distribuido en las comunas de Arica, Camarones, Putre y Gral. Lagos. Con una cobertura a nivel regional de 31.005 de servicio de raciones diarias.

*Fuente: Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas, región de Arica y Parinacota. (JUNAEB)*



b) Normalización Hospital de Arica, Etapa Obras Civiles, código BIP N° 20101828-0, fuente Sectorial.



El proyecto consiste en la construcción y remodelación del complejo de edificios que conforma el Hospital, con un total de 41 mil metros cuadrados de obras civiles aproximadamente. El 70 por ciento de esa superficie corresponderá a nueva infraestructura, en específico, a una placa técnica la cual contendrá en los tres primeros pisos a los servicios de apoyo clínico y diagnóstico, y una torre de tres pisos para la hospitalización de pacientes.

En el mes de agosto de 2007 fueron adjudicadas las obras a la empresa Constructora Moller y Perez Copatos S.A.

La fecha de inicio de las obras fue el 27/10/2007 y se contempla su término para el 20/11/2010. La obra representa una inversión total de M\$31.079.224. Los beneficiarios del proyecto alcanzarían un total de 152.714 habitantes. *Fuente: Servicio de Salud de Arica, región de Arica y Parinacota. (S.S.A.)*

c) Conservación obras fiscales de riego, pretilos río azufre, fuente Sectorial.



Los estanques de evaporación están conformados a través de pretilos y se ubican en la comuna de General Lagos, en el sector Río Azufre, Humapalca, aproximadamente a 90 Km. de Coronel Alcerrec y 230 km. de la ciudad de Arica.

Las obras de reparación consisten en conservar los pretilos existentes con el objetivo de recibir y acumular las aguas del río azufre impidiendo que lleguen al río Lluta, con el objetivo de mitigar los efectos dañinos de la calidad de sus aguas beneficiando a los agricultores del valle de Lluta.

La obra consistió en realizar 4.444 m<sup>3</sup> en movimiento de tierra con una inversión de \$ 99.992.311.- (I.V.A. incl.), con un plazo 90 días corridos.

*Fuente: Dirección de Obras Hidráulicas-MOP, región de Arica y Parinacota. (DOH-MOP.)*

### 3.1.3.- Nivel de Evolución de la ejecución presupuestaria 4to. Trimestre año 2009

En la tabla n° 6 se observa la evolución del Gasto del Presupuesto Sectorial, que considera la inversión sectorial y la sectorial (social).

Tabla n° 6: Nivel evolución del gasto fuente sectorial 2009


Mes	Gasto Mensual (FNDR)	Gasto Acumulado (Ene-Dic)
Enero	3.245.141.127	3.245.141.127
Febrero	2.657.892.723	5.903.033.850
Marzo	5.501.627.713	11.404.661.563
Abril	7.250.404.082	18.655.065.645
Mayo	7.176.833.411	25.831.899.056
Junio	9.509.271.001	35.341.170.057
Julio	7.799.920.287	43.141.090.344
Agosto	8.299.163.004	51.440.253.348
Septiembre	9.106.450.274	60.546.703.622
Octubre	6.886.523.425	67.433.227.047
Noviembre	5.074.663.808	72.507.890.855
Diciembre	6.129.720.987	78.637.611.842
<b>Total</b>	<b>78.637.611.842</b>	

Fuente: Elaboración DIPLAN-GORE, en base a PROPIR 2009

La gráfica siguiente ilustra la tendencia del gasto sectorial en forma mensual durante el año 2009, sin embargo se debe considerar que de acuerdo al procedimiento establecido para la entrega de información de la inversión sectorial por parte de los servicios públicos es de forma trimestral, por lo tanto los antecedentes son solo referenciales, detectándose algunos casos en los cuales los servicios realizan un registro mensual, en tanto otros lo hacen trimestralmente o regulando en forma retroactiva el gasto efectuado en el trimestre anterior.

Sin perjuicio de lo anterior, al analizar las cifras es posible señalar que en base al total de recursos sectoriales ejecutados a diciembre del 2009 (M\$78.637.611) el nivel de evolución trimestral del gasto es: un 14,5% durante el primer trimestre, un 30,4% en el segundo trimestre, un 32,1% en el tercer trimestre, y de un 23% en el cuarto trimestre, lo que permite inferir que los trimestres 2° y 3° se concentra un alto nivel de ejecución, en tanto el 1° y 4° trimestres se observa una baja inferior al promedio de 25%.

Tendencia del gasto Sectorial mensual y acumulado 2009 (Ene-Dic)

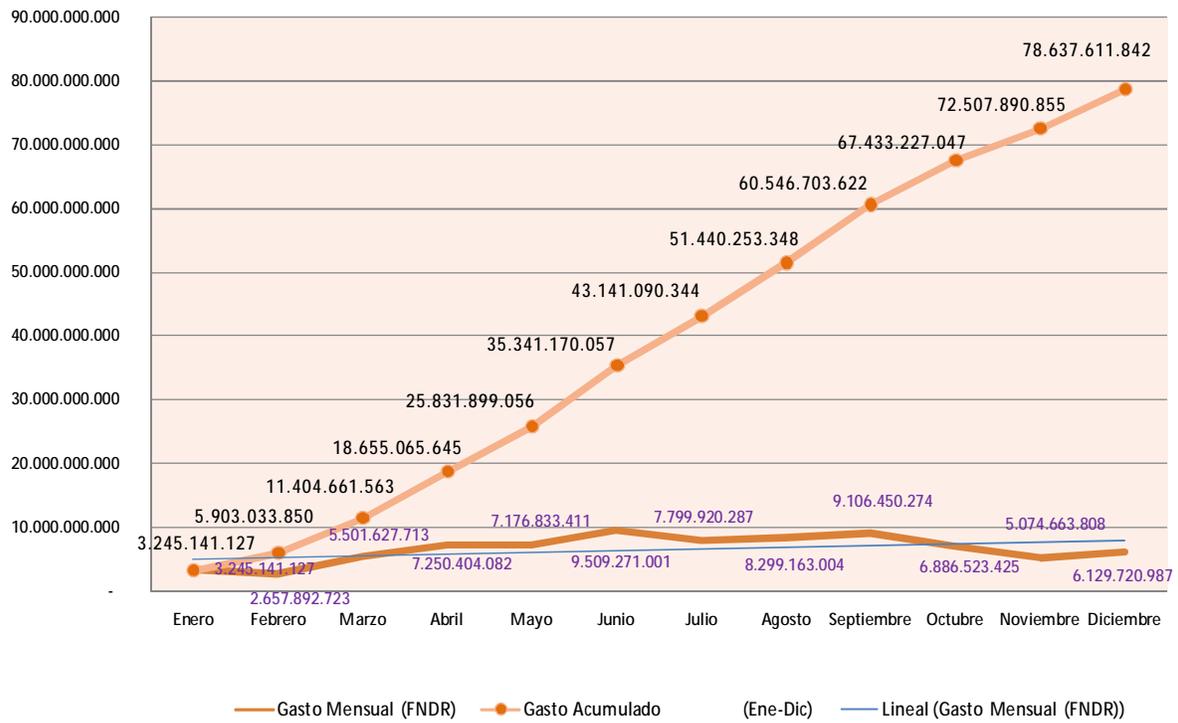

### 3.2.- Nivel de Ejecución Presupuestaria Fuente F.N.D.R. 4to. Trimestre año 2009

Podemos señalar que al término del Cuarto Trimestre se registra un total de 191 iniciativas con fuente F.N.D.R. con una solicitud de recursos igual a M\$18.573.898 incrementándose en M\$1.196.400 aprox. respecto del trimestre anterior debido principalmente a ajustes en la programación de caja y reprogramación de la cartera iniciativas de inversión. Por otra parte, en el mes de Diciembre se registra un presupuesto FNDR vigente de M\$15.974.253, lo que se traduce en un incremento del presupuesto de un 1,9% por sobre lo identificado en el tercer trimestre (Septiembre 2009).

Con el objetivo de determinar el estado de avance de la inversión regional F.N.D.R., se ha realizado un análisis en base a la solicitud de recursos, el nivel de gasto y su evolución, pero a diferencia del análisis sectorial se incluye el concepto de Presupuesto vigente para facilitar la comprensión del proceso y mostrar los recursos disponibles para inversión regional a otorgar por el Gobierno Regional a unidades técnicas de la región.

#### 3.2.1.- Nivel de Ejecución Presupuestaria 4to. Trimestre año 2009

La tabla n° 7 expone el Presupuesto Vigente en base a la Ley de Presupuestos del año 2009, correspondiendo al Gobierno Regional de Arica y Parinacota un presupuesto original de M\$9.878.395<sup>6</sup>, monto que se ha ido incrementando en base solicitudes de fondos vía provisiones<sup>7</sup> y otros fondos, a diciembre se llega a un presupuesto vigente de M\$15.974.253<sup>8</sup>.

Tabla n° 7: Cuadro comparativo presupuesto F.N.D.R. Vigente y Gasto mensual.

Mes	Gasto Mensual (FNDR)	Gasto Acumulado (Ene-Dic)	Ppto. vigente por mes	% Gasto (base Ppto. vigente)
Enero	1.857.652.773	1.857.652.773	9.873.395.000	18,8%
Febrero	1.326.508.915	3.184.161.688	12.001.534.000	26,5%
Marzo	1.192.441.359	4.376.603.047	12.589.174.000	34,8%
Abril	1.130.420.157	5.507.023.204	12.589.174.000	43,7%
Mayo	1.341.040.727	6.848.063.931	12.589.174.000	54,4%
Junio	1.317.141.278	8.165.205.209	13.382.686.000	61,0%
Julio	1.035.594.571	9.200.799.780	14.694.193.000	62,6%
Agosto	1.020.359.439	10.221.159.219	14.587.531.000	70,1%
Septiembre	663.329.010	10.884.488.229	15.674.253.000	69,4%
Octubre	1.289.132.235	12.173.620.464	15.674.253.000	77,7%
Noviembre	1.379.257.993	13.552.878.457	15.674.253.000	86,5%
Diciembre	2.266.348.652	15.819.227.109	15.974.253.000	99,0%
<b>Total Gasto a Diciembre</b>	<b>15.819.227.109</b>			

<sup>6</sup> LEY de PRESUPUESTO. 2009, GORE. Partida 05, Capítulo 75, Programa 02. Ministerio del Interior.

<sup>7</sup> Provisiones identificadas Fondo de Infraestructura Educacional (FIE).

<sup>8</sup> Presupuesto Vigente no considera concepto de Deuda Flotante, según información SUBDERE.

Mediante el Decreto N° 1.388 se registra el único incremento desde septiembre a diciembre por un monto de M\$ 300.000 en el presupuesto vigente, lo anterior por concepto de provisión FIE.

Al término del 4to. Trimestre (Diciembre) se logro una ejecución de un 99,03% del total de presupuesto FNDR vigente, ocupando el 13°. lugar entre los Gobiernos Regionales del país con mejor ejecución, acercándose al promedio nacional correspondiente a un 99,4%.

Un antecedente a destacar respecto del nivel de ejecución presupuestaria logrado por el Gobierno Regional de Arica y Parinacota en comparación al año 2008, es el nivel de gasto logrado en el presente año, a modo de ejemplo: al mes de Mayo del 2008 fue de un 9,6%(M\$1.301.475), en Mayo del 2009 el nivel de gasto llegó a un 54,4% (M\$6.848.064), asimismo en el mes de septiembre del 2008 se llevo a una ejecución del 56,5% (M\$7.615.688) en septiembre del presente se logra una ejecución del 69,4% (M\$10.884.488) y en el mes de diciembre del 2008 se llevo a un 98,6% (M\$16.460.848), en tanto en diciembre del 2009 se llegó a una ejecución del 99,03% (M\$15.819.227)

### 3.2.2.-Nivel de Avance de la Programación 2009 con Fuente F.N.D.R por Unidad Técnica

La tabla n°8 busca identificar el nivel de avance de las unidades técnicas, pero al igual que el análisis de la fuente sectorial, está basado en la programación realizada para cada iniciativa, o sea, la base de cálculo es la solicitud 2009, la cual será comparada con el gasto acumulado efectuado a Diciembre del 2009, según lo informado por el GORE.

En términos de Avance de la programación 2009 de las iniciativas de inversión podemos decir que al mes de diciembre las unidades técnicas lograron ejecutar un 85,2% (M\$ 15.819.227) de la programación anual (M\$18.573.898).

Cabe precisar que este antecedente no puede ser considerado como un índice de eficiencia<sup>9</sup>.

<sup>9</sup> Según acuerdo reunión CRI con fecha 18.05.09, se determina utilizar la siguiente fórmula como índice de eficiencia del gasto (Eficiencia Gasto Trimestre n = Gasto Efectuado Trimestre n/Presupuesto Asignado Trimestre n). En tanto la formula (Avance Programación n 2009= Gasto Efectuado Trimestre n/Solicitud recursos Trimestre n 2009), da respuesta al nivel de avance de las iniciativas o servicios, pero considerando como base la solicitud de recursos del año, que según programación inversión se debería realizar, en este último caso cabe precisar que el avance no solo responde al gasto efectuado, sino a factores de tiempo en procesos como la aprobación de recursos, elaboración de bases TTR, levantamiento, postulación, adjudicación de licitaciones, causales que pueden incidir en el retraso o aplazamiento del término de la etapa del proyecto, disminuyendo el nivel de avance de iniciativas acorde a lo programado en ficha.

Tabla n° 8: Nivel de Avance Programación Fuente F.N.D.R. 4to. Trimestre 2009

Unidad Técnica	Total Solicitado 2009	Total Inv. Ejecutada a Dic . 2009	Dif. por Ejecutar acorde a Programa 2009	Porcentaje Ejecución a Dic. 2009
Subsecretaría de Trabajo	846.258.000	846.258.000	-	100,0%
Instituto Nacional del Deporte	37.710.036	37.710.036	-	100,0%
Comisión Nacional del Medio Ambiente	33.864.000	33.864.000	-	100,0%
Gendarmería de Chile, Dirección Regional	15.250.000	15.250.000	-	100,0%
Subsecretaría de Desarrollo Regional	12.800.000	12.800.000	-	100,0%
Servicio Nacional de Menores	2.945.800	2.945.800	-	100,0%
Seremi de Salud	650.000	650.000	-	100,0%
Servicio Nacional de Aduanas	432.000	432.000	-	100,0%
Fundación Integra	17.889.419	17.889.418	1	100,0%
Dirección de Obras Hidráulicas	261.613.065	261.612.690	375	100,0%
Corporación Nacional Forestal	12.472.000	12.471.940	60	100,0%
Dirección Obras Portuarias	23.438.000	23.437.000	1.000	100,0%
Junta Nacional de Jardines Infantiles	157.426.803	156.864.633	562.170	99,6%
Universidad de Tarapacá	128.968.352	128.398.353	569.999	99,6%
Dirección de Arquitectura	1.576.853.326	1.567.797.596	9.055.730	99,4%
Dirección Vialidad	3.620.008.531	3.555.087.986	64.920.545	98,2%
Seremi de Vivienda y Urbanismo	2.459.176.235	2.288.018.993	171.157.242	93,0%
Carabineros de Chile	263.954.000	241.689.116	22.264.884	91,6%
Gobierno Regional	4.050.122.707	3.555.399.725	494.722.982	87,8%
Policía de Investigaciones	37.142.000	30.760.000	6.382.000	82,8%
I. Municipalidad de Putre	227.353.809	187.613.508	39.740.301	82,5%
I. Municipalidad de Gral Lagos	394.320.373	317.362.600	76.957.773	80,5%
Servicio de Salud	640.291.026	470.867.357	169.423.669	73,5%
I. Municipalidad de Arica	2.810.648.981	1.764.171.238	1.046.477.743	62,8%
I. Municipalidad de Camarones	401.795.008	127.467.776	274.327.232	31,7%
Servicio Nacional de Turismo	539.060.000	162.407.344	376.652.656	30,1%
Servicio de Vivienda y Urbanización	1.455.000	-	1.455.000	0,0%
<b>Total general</b>	<b>18.573.898.471</b>	<b>15.819.227.109</b>	<b>2.754.671.362</b>	<b>85,2%</b>


Fuente: Elaboración DIPLAN-GORE, en base a PROPIR 2009 DACOG-GORE. (S.G.I.)

Realizando una comparación entre la programación y ejecución presupuestaria entre los meses de junio y diciembre podemos señalar que:

- Se registra un aumento del nivel avance de la programación 2009 pasando de un 61,01%(junio) a un 69,4% (Septiembre) y un 85,2% en diciembre.

La gráfica expone el nivel de avance de la programación 2009 por servicio, en color azul los recursos efectivamente ejecutados al mes de diciembre y en color rojo la cantidad de recursos que falta por ejecutar según programación 2009.

### Nivel de Avance Programación F.N.D.R. 4to. Trimestre 2009 (En base a Solicitud Programada 2009)

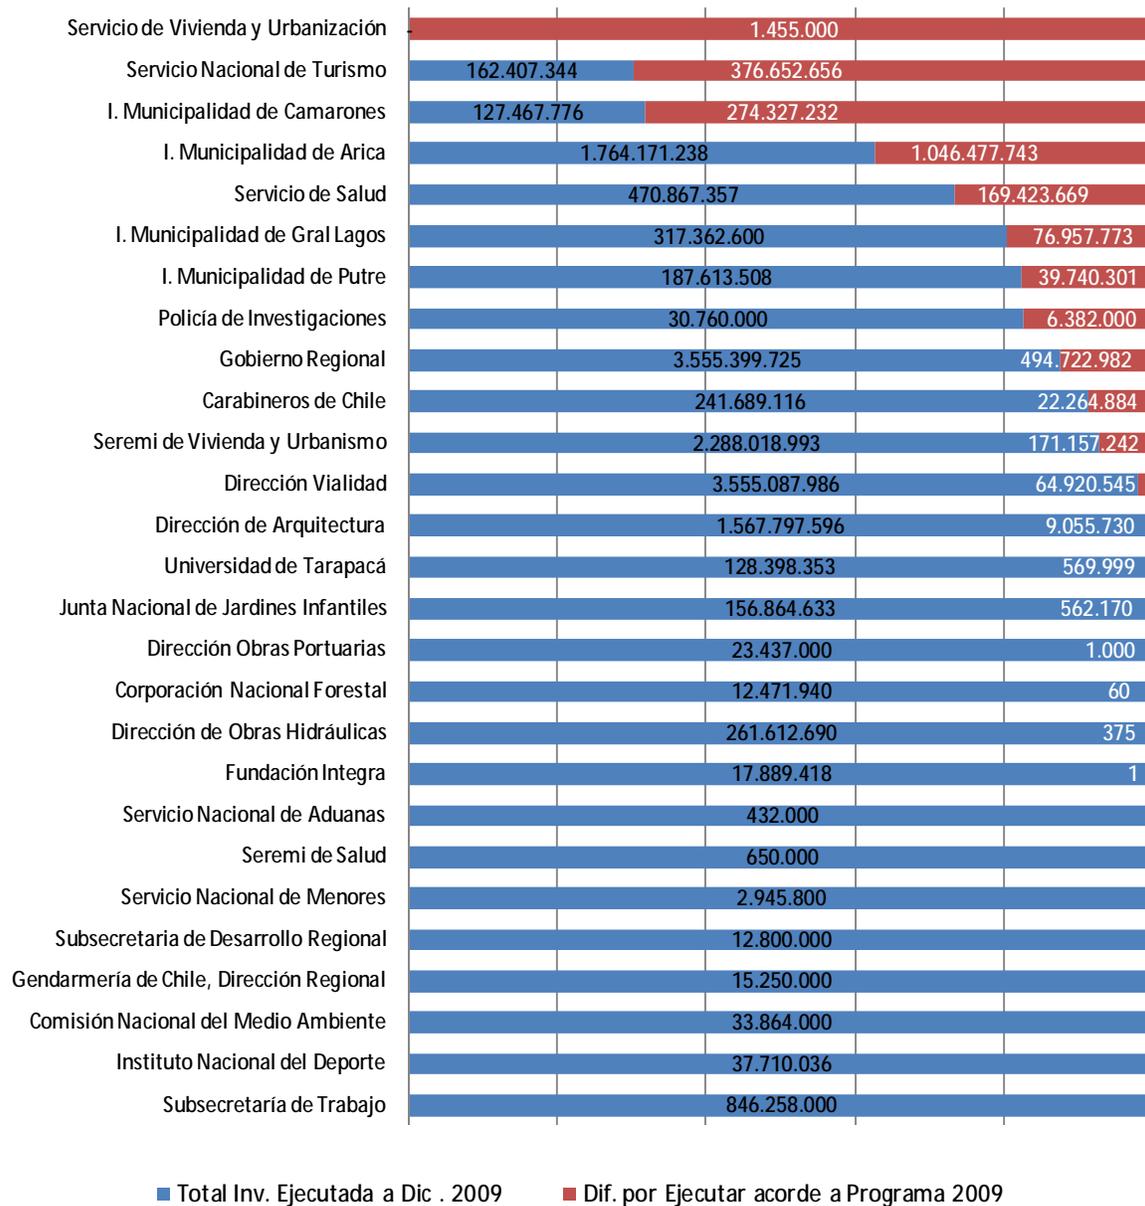

### 3.2.3.- Identificación de Iniciativas de Inversión relevantes con Fuente F.N.D.R.

A continuación se identifican algunas iniciativas de inversión con fuente de financiamiento F.N.D.R. destacadas:

- a) Proyecto Adquisición de vehículos para las unidades y destacamentos dependientes de la prefectura de carabineros Arica nro. 1. (comisarias, subcomisarias, tenencias, retenes y servicios especializados), con el objetivo de adquirir vehículos para carabineros de Chile, conforme el siguiente detalle:



- 11 motocicletas todo terreno, marca honda, modelo xr250 tornado
- 04 motos transito, marca BMW, modelo r900 rt
- 03 automóviles radio patrullas, marca Chevrolet, modelo OPTRA ii ls nb 4p 1.6 mt ac
- 07 camionetas policiales, marca Nissan, modelo terrano dx l4753c, 4x.
- 01 camioneta policial, marca Nissan, modelo terrano dx e2201 4x2.
- 04 camioneta policial, marca Nissan, modelo terrano d22 dc 4x2.
- 01 reten movil, mercedes Benz, modelo sprinter 313 cdi furgon
- 01 bus, marca mercedes Benz, modelo of 1722/52 Svelto 4.800.

La inversión llegó a los \$ 423.821.000 (cuatrocientos veintitrés millones ochocientos veintiún mil pesos) financiado por la circular 36 DIPRES, con cargo al subtítulo 29 adquisición no activos no financieros, ítem 3 vehículos, del presupuesto del fondo nacional de desarrollo regional, de la región Arica y Parinacota. Los beneficiarios corresponden a la comunidad de Arica, 189.000 habitantes aprox.

*Fuente: Carabineros de Chile, región de Arica y Parinacota.*





b) *Programa de Transferencia Prácticas Ambientales CEA Las Maitas, Arica*, el cual dentro de sus actividades incluye la capacitación en materias ambientales, recursos naturales y uso de las áreas silvestres protegidas de la región a estudiantes de 4 a 12 años, además de la transferencia tecnológica a establecimientos educacionales en certificación ambiental.

El monto de inversión llegó a los \$ 13.560.000, con un plazo de ejecución de 24 meses. Los beneficiarios corresponden a 1.600 estudiantes, pero a la fecha han participado 2.144 estudiantes de la región.



*Fuente: Corporación Nacional Forestal, región de Arica y Parinacota. (CONAF)*

c) *Conservación Posta de Salud Rural de Ticnamar, Comuna de Putre. Código BIP 30084044-0. Fuente FNDR.*



El proyecto consistió en la reparación de la Posta de Salud Rural ubicada en la localidad de Ticnamar, producto del deterioro ocasionado por el paso de los años, lo que permitirá prolongar la vida útil de la posta y mantener un estándar adecuado para su correcto funcionamiento durante los próximos años. En el mes de julio de 2009 fueron adjudicadas las obras a la empresa Constructora C&M Ltda., por un monto total de M\$ 55.556.

La fecha de inicio de las obras fue el 24/07/2009 y fue recepcionada provisoriamente sin observaciones el 30/11/2009. Los beneficiarios del proyecto alcanzarían un total de 204 habitantes.

*Fuente: Servicio de Salud de Arica, región de Arica y Parinacota. (S.S.A.)*

d) Construcción estanque Lluscuma, Putre – Mejoramiento canal Chacacagua, poblado de Socoroma, comuna de Putre”



El proyecto Lluscuma, consiste en la construcción de un estanque acumulador de 2.970 m<sup>3</sup> de capacidad, en hormigón armado, cuyas dimensiones son 30\*30\*3,3 m (largo, ancho, alto promedio). Revestir una acequia artesanal existente (de tierra) para transformarlo en un canal de 1.280 metros lineales, con sus paramentos en albañilería de piedra (mampostería) de 0,15 m. de espesor y radier de hormigón de 0,10 m. de espesor, sección 0,50 x 0,35 m, Beneficiando a 56 pequeños agricultores.

El canal Chacacagua corresponde a 975 ml de canal en loseta prefabricada, beneficiando a 73 pequeños agricultores. La inversión para ambos proyectos corresponde a \$ 526.508.335.- (I.V.A. incl.), con un plazo de 210 días corridos.

*Fuente: Dirección de Obras Hidráulicas-MOP, región de Arica y Parinacota. (DOH-MOP.)*

### 3.2.4.- Nivel de inversión F.N.D.R. por sector económico.

La tabla n° 9 identifica los sectores en los cuales está enfocada la inversión realizada a través del F.N.D.R., junto con ello expone la cantidad de recursos solicitados, el nivel de gasto efectuado en cada uno de ellos y el porcentaje de avance de acuerdo a la programación anual.

Podemos señalar que durante el cuarto trimestre a nivel regional los sectores que registran una mayor cantidad de recursos solicitados 2009 son: Transporte con un 24,1%(M\$4.483.350), Multisectorial con un 23,9%(M\$4.447.743) y Educación y Cultura con un 19,4%(M\$3.609.520).


A modo de ejemplo el análisis debe ser el siguiente: a nivel regional la solicitud de recursos para financiamiento de iniciativas de inversión, que cuentan con aprobación del CORE, y que corresponden al sector Transporte según programación solicitan M\$4.483.350 (24,1%) del total Solicitado 2009, que al mes de Diciembre registra un gasto acumulado de M\$4.352.771, esto significa un nivel de avance en la ejecución del 97,1% del total programado para el año 2009 en ese sector específico.

Tabla n°9: Identificación sectores de inversión fuente F.N.D.R 4to. Trimestre 2009.

Sector	Total Solicitado año 2009 (1)	Inv. Ejecutada a Dic . 2009 (2)	Dif. por Ejecutar acorde a Programa 2009	Porcentaje Ejecución a Dic. 2009
Pesca	52.938.000	52.937.000	1.000	100,0%
Agua Potable y Alcantarillado	734.899.917	715.899.916	19.000.001	97,4%
Transporte	4.483.350.245	4.352.771.380	130.578.865	97,1%
Deportes	741.960.553	711.950.203	30.010.350	96,0%
Justicia	449.322.702	429.538.702	19.784.000	95,6%
Educación y Cultura	3.609.520.273	3.193.663.894	415.856.379	88,5%
Energía	870.066.331	748.097.734	121.968.597	86,0%
Silvoagropecuario	894.137.065	743.544.005	150.593.060	83,2%
Defensa y Seguridad	412.235.494	342.796.040	69.439.454	83,2%
Multisectorial	4.447.743.565	3.435.728.170	1.012.015.395	77,2%
Salud	1.218.553.326	841.524.721	377.028.605	69,1%
Ind., Com., Fzas. y Turismo	625.685.000	249.032.344	376.652.656	39,8%
Vivienda	33.486.000	1.743.000	31.743.000	5,2%
Comunicaciones	-	-	-	0,0%
<b>Total general</b>	<b>18.573.898.471</b>	<b>15.819.227.109</b>	<b>2.754.671.362</b>	<b>85,2%</b>

Fuente: Elaboración DIPLAN-GORE, en base a PROPIR 2009 DACOG-GORE. (S.G.I.)

La gráfica nos permite observar los sectores en los cuales están enfocados los recursos solicitados y asignados a través del FNDR, esto en base a la cartera de inversión que posee el GORE y que además cuenta con las aprobaciones respectivas, junto con ello es posible observar la cantidad de recursos que se ejecutaron o gastaron al término del año 2009.

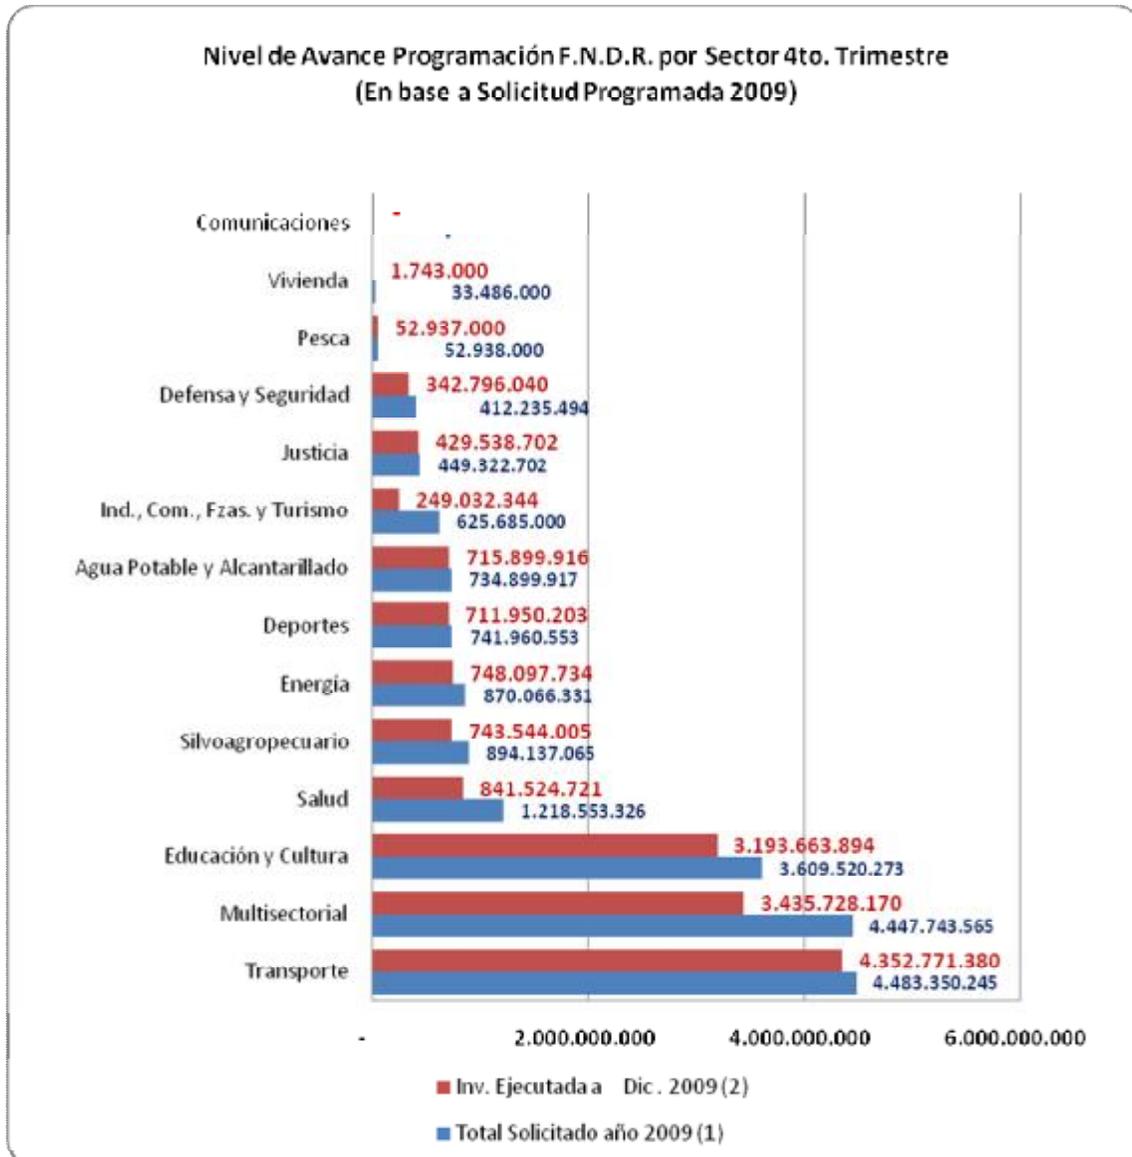

### 3.2.5.- Nivel de Evolución de la ejecución presupuestaria 4to. Trimestre año 2009 (En base a Presupuesto vigente a Diciembre)

En la tabla n° 10 podemos visualizar la evolución del gasto del presupuesto F.N.D.R. en función del presupuesto vigente por mes, según lo informado por el Gobierno Regional, al mes de Octubre se registró un gasto del 77,7% respecto del presupuesto vigente, también podemos visualizar el gasto obtenido al mes de Noviembre con lo cual se llega a un 86,5% del presupuesto vigente y finalmente en el mes de diciembre se llegó a una ejecución del 99,03% (M\$15.819.227) del presupuesto vigente(M\$15.974.253).


Tabla n° 10: Nivel evolución del gasto fuente F.N.D.R.3er. Trimestre del 2009

Mes	Gasto Mensual (FNDR)	Gasto Acumulado (Ene-Dic)
Enero	1.857.652.773	1.857.652.773
Febrero	1.326.508.915	3.184.161.688
Marzo	1.192.441.359	4.376.603.047
Abril	1.130.420.157	5.507.023.204
Mayo	1.341.040.727	6.848.063.931
Junio	1.317.141.278	8.165.205.209
Julio	1.035.594.571	9.200.799.780
Agosto	1.020.359.439	10.221.159.219
Septiembre	663.329.010	10.884.488.229
Octubre	1.289.132.235	12.173.620.464
Noviembre	1.379.257.993	13.552.878.457
Diciembre	2.266.348.652	15.819.227.109
<b>Total</b>	<b>15.819.227.109</b>	

Fuente: Elaboración propia en base a antecedentes gasto mensual aportado por DACOG  
Detalle de presupuesto vigente no incluye deuda flotante (SUBDERE-DIPRES)

Cabe señalar que este nivel de ejecución presupuestaria registrado a diciembre (99,03%), a diferencia del año anterior se logró a partir de una fuerte cartera de proyectos de arrastre del año 2008, lo que significa que la actual cartera de proyectos FNDR fue creada y aprobada en gran medida por el actual Gobierno Regional.

Podemos visualizar esta situación graficando el nivel de evolución de la ejecución presupuestaria, en términos del gasto real mensual, lo que nos demuestra el alto nivel de inversión inicial, se observa una pequeña baja en la ejecución durante los meses de marzo-abril y una recuperación en mayo-junio, pero en términos de gasto acumulado se logra con creces un nivel de eficiencia del gasto llegando en el mes de diciembre a un 99,03% (M\$15.819.227).

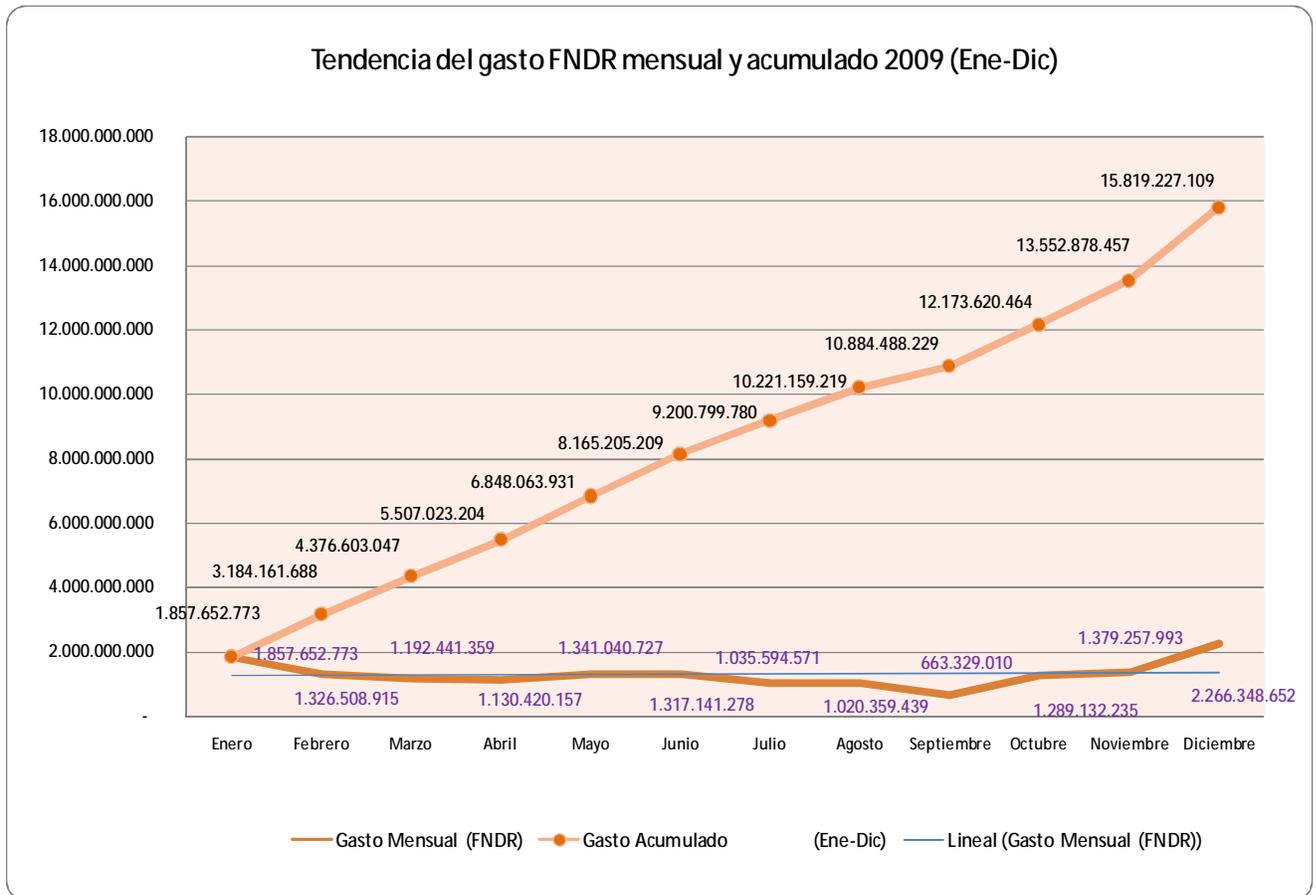

## 4.- Conclusiones

En base a los antecedentes aportados por los servicios responsables y el Gobierno Regional, a través del Sistema de Gestión de Inversión (S.G.I.) podemos concluir que al término del cuarto trimestre del año 2009 la inversión (FNDR y Sectorial) solicitada e informada llega a M\$108.721.606, de lo cual un 35,6%(M\$38.754.033) corresponde a iniciativas con fuente sectorial, un 47,3% (M\$51.393.674) corresponde a iniciativas con fuente Sectorial (Social) y un 17,1%(M\$18.573.898) corresponde a iniciativas con fuente F.N.D.R.<sup>10</sup>.

De acuerdo a lo anterior, si consideramos la sumatoria de las diferentes fuentes de financiamiento (Sectorial, Sectorial(S) y F.N.D.R.) por institución, podemos señalar que al menos un 90% (M\$105.347.455) se concentra en 13 servicios de un total de 45 informantes, entre los que destacan I.N.P., S.S.A., SERVIU, MOP-Vialidad, JUNAEB, I.N.D., MOP-Arquitectura, I.M.A., GORE, SENCE y MOP-Dir. de Obras Hidráulicas, ya sea como servicio responsable de la inversión o unidad técnica <sup>11</sup>.

En términos de la inversión Sectorial podemos señalar que en base a los antecedentes aportados por los servicios responsables<sup>12</sup> se registra una ejecución promedio del 87,2%(M\$78.637.611) de los recursos solicitados para las iniciativas informadas<sup>13</sup> ejecutadas por los servicios en el año 2009, donde un 78,3%(M\$30.334.119) corresponde a la ejecución de fuente Sectorial, en tanto para las iniciativas identificadas como Sectorial (Social) se registra un avance del 94,0%(M\$48.303.492).

De acuerdo a lo anterior, al término del cuarto trimestre 26 servicios han informado y registrado un avance por sobre el 50%, de los cuales 14 servicios están por sobre el 90% de ejecución de los recursos sectoriales, entre los que destacan<sup>14</sup>: SERCOTEC, SERPLAC, CONAMA, SERNAM, INDAP, S.A.G., CONAF, SENAME, Consejo Nac. De la Cultura y las Artes, MOP-DOP, MOP-DOH, JUNAEB, MOP-Dir. Arquitectura, IOS (Ex – INP), SENCE, entre otros. En el otro extremo encontramos casos a considerar como son: Gendarmería, PROCHILE, SERNATUR, FONADIS, que registran niveles de gasto por debajo del 50% de los recursos solicitados informados.

En términos de la inversión F.N.D.R., podemos señalar que en base a los antecedentes aportados por el Gobierno Regional se registra una solicitud de recursos igual a M\$18.573.898 incrementándose en M\$1.196.400 aprox. respecto de la solicitud registrada en el trimestre anterior, debido a ajustes en la programación de caja y reprogramación de la cartera iniciativas de inversión, en tanto se registra un presupuesto vigente de M\$15.974.253.

<sup>10</sup> Considerar antecedentes expuestos en punto 3.2. del presente informe sobre ajustes y reprogramación, además consulta Primer Informe de Avance PROPIR 2009 sobre aspectos a considerar para análisis de inversión.

<sup>11</sup> Ver tabla n° 2 Inversión pública con solicitud 2009 por fuente de financiamiento y servicio responsable y/o unidad técnica.

<sup>12</sup> Ver tabla n° 3 Nivel de Inversión Sectorial solicitado 2009 y gasto ejecutado al Primer Semestre.

<sup>13</sup> Ver anexo 1 Detalle avance iniciativas de inversión pública fuente Sectorial por Servicio Responsable 1er. Semestre, PROPIR 2009.

<sup>14</sup> Ver Tabla n° 5: Nivel de Avance del Programación, Fuente Sectorial (base programación ejecución 2009)

Cabe destacar el nivel de ejecución logrado por las unidades técnicas al término del año 2009, el cual llega a un 99,03%(M\$15.819.227) del presupuesto vigente en el mes de diciembre, lo que en comparación con otros Gobiernos Regionales significa ocupar el 13° lugar, en tanto en el mes de noviembre y en base al presupuesto vigente significó lograr una ejecución del 86,5%(M\$13.551.888) ocupando el 11° lugar.

# ANEXOS

# ANEXO I

---

Detalle avance iniciativas de inversión pública fuente Sectorial por Servicio  
Responsable al 4to. Trimestre (dic.), PROPIR 2009.

ESTADO DE AVANCE 4to. TRIMESTRE PROPIR 2009: FUENTE DE FINANCIAMIENTO SECTORIAL

Sistema de Gestión de Inversión (Diciembre 2009)

Unidad Técnica	Código	Nombre de la Iniciativa	Item Presupuestario	Ubicación Geográfica	Sector	Fuente Financiamiento	Valores						
							Suma de Costo Ajustado	Suma de Gastado Años Anteriores	Suma de Solicitado	Suma de Saldo Próximos Año	Suma de Saldo Años Restantes	Suma de Inv. Ejecutada a Dic. 2009	Suma de Porcentaje Ejecución a Dic. 2009
Comisión Nacional de Desarrollo indígena	20161884-0	PUESTA EN VALOR DE 1 CENTRO CEREMONIAL INDIGENA Y TRASPASO DEL CENTRO CEREMONIAL CERRO SOMBRERO A UNA ORGANIZACION INDIGENA URBANA DE ARICA	Transf. Corrientes al Sector Privado (24.01)	Regional	Educación y Cultura	Sectorial	7.000.000	-	7.000.000	-	-	2.100.000	30,0%
	2016189-0	Concurso para iniciativas de difusión Local. PROMOCION Y VALIDACION DEL INSTITUTO DE CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGIA INDIGENA EN ARICA	Transf. Corrientes al Sector Privado (24.01)	Regional	Educación y Cultura	Sectorial	10.000.000	-	10.000.000	-	-	10.000.000	100,0%
	20161894-0	ADQUISICION DE INSTRUMENTOS MUSICALES ANDINOS. FORTALECIMIENTO CURRICULAR DE JARDINES INTERCULTURALES	Transf. Corrientes al Sector Privado (24.01)	Regional	Educación y Cultura	Sectorial	15.000.000	-	15.000.000	-	-	3.750.000	25,0%
			Transf. Corrientes al Sector Privado (24.01)	Regional	Educación y Cultura	Sectorial	10.000.000	-	10.000.000	-	-	4.000.000	40,0%
	20193653-0	REGULARIZACION, CONSTITUCION Y DEFENSA DE DERECHOS DE AGUAS UTILIZADAS POR INDIGENAS DE LA REGION DE ARICA Y PARINACOTA, 2009	Transf. de Capital al Sector Privado (33.01)	Regional	Silvoagropecuario	Sectorial	6.000.000	-	6.000.000	-	-	-	0,0%
			Transf. de Capital al Sector Privado (33.01)	Regional	Silvoagropecuario	Sectorial	35.000.000	-	35.000.000	-	-	5.600.000	16,0%
	30044538-0	APOYO A LA REGULARIZACION Y SANEAMIENTO DE TITULOS DE PREDIOS PERTENECIENTES A PERSONAS Y ORGANIZACIONES INDIGENAS DE LA REGION DE ARICA Y PARINACOTA, Levantamiento de información, para determinar factibilidad de transfeencias de inmuebles fiscales a personas y/o Organizaciones Indigenas, de la Región	Transf. de Capital al Sector Privado (33.01)	Regional	Silvoagropecuario	Sectorial	30.000.000	-	30.000.000	-	-	9.000.000	30,0%
			Transf. de Capital al Sector Privado (33.01)	Regional	Silvoagropecuario	Sectorial	25.000.000	-	25.000.000	-	-	-	0,0%
	30044540-0	REGULARIZACION Y SANEAMIENTO DE PREDIOS INDIGENAS TRANSFERENCIA A COMUNIDADES INDIGENAS DE INMUEBLES FISCALES	Transf. de Capital al Sector Privado (33.01)	Regional	Silvoagropecuario	Sectorial	20.000.000	-	20.000.000	-	-	20.000.000	100,0%
			Transf. de Capital al Sector Privado (33.01)	Regional	Silvoagropecuario	Sectorial	25.000.000	-	25.000.000	-	-	25.000.000	100,0%
	300445676-0	FAMILIAS INDIGENAS CON OBRAS DE RIEGO Y/O DRENAJE FINANCIADAS POR CONADI	Transf. de Capital al Sector Privado (33.01)	Regional	Silvoagropecuario	Sectorial	434.000.000	-	434.000.000	-	-	434.000.000	100,0%
			Transf. de Capital al Sector Privado (33.01)	Regional	Silvoagropecuario	Sectorial	31.000.000	-	31.000.000	-	-	31.000.000	100,0%
	30045676-0	FAMILIAS INDIGENAS CON OBRAS DE RIEGO Y/O DRENAJE FINANCIADAS POR DIVERSOS ORGANISMOS ESTATALES PROMOCION Y ELABORACION DE PROYECTOS DE RIEGO A FAVOR DE COMUNIDADES Y DEMÁS ORGANIZACIONES INDIGENAS DE LA REGION DE ARICA Y PARINACOTA, 2009	Transf. de Capital al Sector Privado (33.01)	Regional	Silvoagropecuario	Sectorial	35.000.000	-	35.000.000	-	-	-	0,0%
			Transf. Corrientes al Sector Privado (24.01)	Regional	Educación y Cultura	Sectorial	20.000.000	-	20.000.000	-	-	-	0,0%
<b>Total Comisión Nacional de Desarrollo indígena</b>							<b>703.000.000</b>	<b>-</b>	<b>703.000.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>544.450.000</b>	<b>77,4%</b>
Comisión Nacional del Medio Ambiente	015-005-2009	REFORESTEMOS EL VALLE DE CHACA, UTILIZANDO EL SOL COMO ALIADO	Transf. Corrientes a Otras Ent. Públicas	Comunal (Arica)	Multisectorial	Sectorial	9.000.000	-	9.000.000	-	-	5.400.000	60,0%
	015-013-2009	SECADORES SOLARES PARA LOS AGRICULTORES DEL VALLE DE CODPA	Transf. Corrientes a Otras Ent. Públicas	Comunal (Camarones)	Multisectorial	Sectorial	3.550.000	-	3.550.000	-	-	2.150.000	60,6%
	015-015-2009	Diseño y confección, revisión y puesta en valor del material educativo (tipo kit) referente manejo de protección Picaflor de Arica	Transf. Corrientes a Otras Ent. Públicas (24.03)	Comunal (Arica)	Multisectorial	Sectorial	9.000.000	-	9.000.000	-	-	5.400.000	60,0%
	015-022-2009	Reciclado juntos, podemos mejorar nuestro medio ambiente y disfrutar de la herencia	Transf. Corrientes a Otras Ent. Públicas	Comunal (Arica)	Multisectorial	Sectorial	4.000.000	-	4.000.000	-	-	2.400.000	60,0%
	015-032-2009	Niñas y niños en contacto con las energías naturales	Transf. Corrientes a Otras Ent. Públicas	Regional	Multisectorial	Sectorial	4.000.000	-	4.000.000	-	-	2.400.000	60,0%
	<b>Total Comisión Nacional del Medio Ambiente</b>							<b>29.550.000</b>	<b>-</b>	<b>29.550.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>17.750.000</b>
Consejo Nacional de la Cultura y las Artes	(en blanco)	Actividades de Extension Cultural	Transf. Corrientes al Sector Privado (24.01)	Regional	Educación y Cultura	Sectorial	15.000.000	-	15.000.000	-	-	15.000.000	100,0%
		Celebracion días	Transf. Corrientes al Sector Privado (24.01)	Regional	Educación y Cultura	Sectorial	1.250.000	-	1.250.000	-	-	1.250.000	100,0%
		Fiesta Bicentenario	Transf. Corrientes al Sector Privado (24.01)	Regional	Educación y Cultura	Sectorial	25.000.000	-	25.000.000	-	-	25.000.000	100,0%
		Fondos Concursables	Transf. Corrientes al Sector Privado (24.01)	Regional	Educación y Cultura	Sectorial	130.532.079	-	130.532.079	-	-	116.817.979	89,5%
		Muestra de Arte escolar	Transf. Corrientes al Sector Privado (24.01)	Regional	Educación y Cultura	Sectorial	6.760.973	-	6.760.973	-	-	3.889.294	57,5%

Unidad Técnica	Código	Nombre de la Iniciativa	Item Presupuestario	Ubicación Geográfica	Sector	Fuente Financiamiento	Valores						
							Suma de Costo Ajustado	Suma de Gastado Años Anteriores	Suma de Solicitado	Suma de Saldo Próximos Año	Suma de Saldo Años Restantes	Suma de Inv. Ejecutada a Dic. 2009	Suma de Porcentaje Ejecución a Dic. 2009
Consejo Nacional de la Cultura y las Artes	(en blanco)	Progr. Cultura Verano en Buena	Transf.Corrientes al Sector Privado (24.01)	Regional	Educación y Cultura	Sectorial	17.000.000	-	17.000.000	-	-	17.000.000	100,0%
		Programa Acceso Regional	Transf.Corrientes al Sector Privado (24.01)	Regional	Educación y Cultura	Sectorial	55.942.288	-	55.942.288	-	-	41.789.511	74,7%
		Programa Creando Chile en mi barrio	Transf.Corrientes al Sector Privado (24.01)	Regional	Educación y Cultura	Sectorial	52.096.100	-	52.096.100	-	-	28.039.415	53,8%
<b>Total Consejo Nacional de la Cultura y las Artes</b>							<b>303.581.440</b>	<b>-</b>	<b>303.581.440</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>248.786.199</b>	<b>82,0%</b>
Corporación de Fomento de la Producción	(en blanco)	PROGRAMA DE FOMENTO	Transf.Corrientes al Sector Privado (24.01)	Regional	Ind., Com., Fzas. y Turismo	Sectorial	393.406.013	-	393.406.013	-	-	393.406.013	100,0%
		PROGRAMA INNOVA CHILE	Transf.Corrientes al Sector Privado (24.01)	Regional	Ind., Com., Fzas. y Turismo	Sectorial	398.766.737	-	398.766.737	-	-	398.766.737	100,0%
		PROGRAMA TODO CHILE	Transf.Corrientes al Sector Privado (24.01)	Regional	Ind., Com., Fzas. y Turismo	Sectorial	64.910.259	-	64.910.259	-	-	64.910.259	100,0%
		PROGRAMA ZONAS ESPECIALES	Transf.Corrientes al Sector Privado (24.01)	Regional	Ind., Com., Fzas. y Turismo	Sectorial	425.400.760	-	425.400.760	-	-	425.400.760	100,0%
<b>Total Corporación de Fomento de la Producción</b>							<b>1.282.483.769</b>	<b>-</b>	<b>1.282.483.769</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.282.483.769</b>	<b>100,0%</b>
Corporación Nacional Forestal	(en blanco)	Administración y Fiscalización Forestal	Programas De Inversión (31.03)	Regional	Silvoagropecuario	Sectorial	1.900.000	-	1.900.000	-	-	823.534	43,3%
		Depto. Areas Protegidas y Medio Ambiente (DAPMA) Protección	Programas De Inversión (31.03)	Regional	Silvoagropecuario	Sectorial	31.000.000	-	31.000.000	-	-	20.408.000	65,8%
		Fomento Forestal	Programas De Inversión (31.03)	Regional Provincial	Silvoagropecuario	Sectorial	4.771.000	-	4.771.000	-	-	2.895.000	60,7%
		Gestión Territorial	Programas De Inversión (31.03)	(Parinacota)	Silvoagropecuario	Sectorial	16.866.000	-	16.866.000	-	-	3.891.000	23,1%
<b>Total Corporación Nacional Forestal</b>							<b>54.537.000</b>	<b>-</b>	<b>54.537.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>28.017.534</b>	<b>51,4%</b>
Corporaciones de Asistencia Judicial	(en blanco)	EDIFICACION JUZGADOS	Programas De Inversión (31.03)	Comunal (Arica)	Justicia	Sectorial	10.000.000	-	-	10.000.000	-	-	#DIV/0!
<b>Total Corporaciones de Asistencia Judicial</b>							<b>10.000.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>10.000.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>#DIV/0!</b>
Dirección de Arquitectura	30061352-0	REPARACION ESTRUCTURAL EDIFICIO SERVICIOS PUBLICOS	Proyectos (31.02)	Regional	Multisectorial	Sectorial	1.339.583.466	-	1.339.583.466	-	-	1.101.973.575	82,3%
	30080388-0	CONSERVACION DE INSTALACIONES EDIFICIO SERVICIOS PUBLICOS ARICA	Proyectos (31.02)	Regional	Multisectorial	Sectorial	493.378.000	-	493.378.000	-	-	179.772.340	36,4%
<b>Total Dirección de Arquitectura</b>							<b>1.832.961.466</b>	<b>-</b>	<b>1.832.961.466</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.281.745.915</b>	<b>69,9%</b>
Dirección de Obras Hidráulicas	27000276	Factibilidad Sistemas de APR Valles de Lluta y Azapa 2008	Transf.Corrientes al Sector Privado (24.01)	Provincial (Parinacota)	Agua Potable y Alcantarillado	Sectorial	65.000.000	35.000.000	30.000.000	-	-	30.000.000	100,0%
	27000277	Conservación varios Sistemas de APR de Arica y Parinacota. 2008	Transf.Corrientes al Sector Privado (24.01)	Provincial (Parinacota)	Agua Potable y Alcantarillado	Sectorial	52.461.610	35.809.429	16.652.181	-	-	16.652.181	100,0%
		Conservación Varios Sistemas de APR Región de Arica y Parinacota 2009	Transf.Corrientes al Sector Privado (24.01)	Regional	Agua Potable y Alcantarillado	Sectorial	40.000.000	-	20.000.000	20.000.000	-	-	0,0%
	27000309	Reposición de Emergencia de Redes de Agua Potable Villa Frontera y La Ponderosa, Comuna de Arica	Transf.Corrientes al Sector Privado (24.01)	Comunal (Arica)	Agua Potable y Alcantarillado	Sectorial	40.000.000	-	20.000.000	20.000.000	-	-	0,0%
	27000310	Estudio de Factibilidad y Diseño para sistemas de APR de Cuya y Putre y Diseño Mejoramiento sistema de tratamiento de Aguas Servidas de San Miguel de	Transf.Corrientes al Sector Privado (24.01)	Regional	Agua Potable y Alcantarillado	Sectorial	85.000.000	-	1.000	84.999.000	-	-	0,0%
	30044284	Estudio Instalación Sistema de Agua Potable Rural de Chaca, Arica	Transf.Corrientes al Sector Privado (24.01)	Provincial (Arica)	Comunicaciones	Sectorial	25.000.000	13.250.000	11.750.000	-	-	11.750.000	100,0%
	30062676	Conservación y Mejoramiento Canal Lauca 2009 Plan Especial	Transf.Corrientes al Sector Privado (24.01)	Provincial (Parinacota)	Silvoagropecuario	Sectorial	471.562.077	-	471.562.077	-	-	365.655.373	77,5%
	30069191	Mano de Obra	Transf.Corrientes al Sector Privado (24.01)	Comunal (Arica)	Silvoagropecuario	Sectorial	238.182.999	-	238.182.999	-	-	238.182.999	100,0%
		Construcción Infraestructura en Cauce Urbano Río San José Arica.	Transf.Corrientes al Sector Privado (24.01)	Comunal (Arica)	Silvoagropecuario	Sectorial	44.588.950	-	25.410.400	19.178.550	-	8.161.550	32,1%
		Estudio de Impacto Ambiental Obras Fluviales Río San José	Transf.Corrientes al Sector Privado (24.01)	Regional	Silvoagropecuario	Sectorial	70.000.000	-	9.828.000	51.354.000	8.818.000	-	0,0%
	30069905	Sector Urbano de Arica Región de Arica y parinacota	Transf.Corrientes al Sector Privado (24.01)	Comunal (Arica)	Silvoagropecuario	Sectorial	10.000.000	-	10.000.000	-	-	10.000.000	100,0%
	30077578	Construcción Entubamiento Canal Azapa	Transf.Corrientes al Sector Privado (24.01)	Comunal (Arica)	Silvoagropecuario	Sectorial	10.000.000	-	10.000.000	-	-	10.000.000	100,0%
		Construcción Infraestructura en Cauces Naturales Azapa, etapa 2	Transf.Corrientes al Sector Privado (24.01)	Comunal (Arica)	Silvoagropecuario	Sectorial	165.296.885	25.000.000	140.296.885	-	-	140.296.885	100,0%
		Construcción Infraestructura en Cauces Naturales, Lluta, etapa 2	Transf.Corrientes al Sector Privado (24.01)	Comunal (Arica)	Silvoagropecuario	Sectorial	281.649.876	-	281.649.876	-	-	281.649.876	100,0%
	30078364	Conservación instalaciones canal Lauca, Azapa	Transf.Corrientes al Sector Privado (24.01)	Regional	Silvoagropecuario	Sectorial	107.700.000	-	107.700.000	-	-	107.700.000	100,0%

Unidad Técnica	Código	Nombre de la Iniciativa	Item Presupuestario	Ubicación Geográfica	Sector	Fuente Financiamiento	Valores						
							Suma de Costo Ajustado	Suma de Gastado Años Anteriores	Suma de Solicitado	Suma de Saldo Próximos Año	Suma de Saldo Años Restantes	Suma de Inv. Ejecutada a Dic. 2009	Suma de Porcentaje Ejecución a Dic. 2009
Dirección de Obras Hidráulicas	30080258	Instalación Sistema de Agua Potable Rural, Km. 13 - km 18, Valle de Azapa	Transf.Corrientes al Sector Privado (24.01)	Comunal (Arica)	Agua Potable y Alcantarillado	Sectorial	25.000.000	-	10.000.000	15.000.000	-	-	0,0%
	30080273	Instalación Sistema de Agua Potable Rural, Km. 32 - km 45, Valle de Azapa	Transf.Corrientes al Sector Privado (24.01)	Comunal (Arica)	Agua Potable y Alcantarillado	Sectorial	25.000.000	-	10.000.000	15.000.000	-	-	0,0%
	30081889	Conservación de obras de Fiscales de riego, Pretiles - Río Azufre. Conservación de Riberas de Cauces Naturales, Arica y Parinacota	Sector Privado (24.01) Transf.Corrientes al	Comunal (Arica)	Silvoagropecuario	Sectorial	100.000.000	-	99.992.311	-	7.689	99.992.311	100,0%
	30081896	Conservación de obras Fiscales de Riego XV Región San José (2009 - 2011)	Sector Privado (24.01) Transf.Corrientes al	Regional	Silvoagropecuario	Sectorial	181.395.559	-	181.395.559	-	-	139.535.045	76,9%
	30088041	Conservación de obras Fiscales de Riego XV Región San José Rural Plan Especial Mano de Obra	Sector Privado (24.01) Transf.Corrientes al	Regional	Silvoagropecuario Agua Potable y Alcantarillado	Sectorial	93.423.200	-	93.423.200	-	-	93.423.200	100,0%
	27000007-0	Programa de Supervisión y Asesoría de Comités de APR	Sector Privado (24.01)	Regional	Alcantarillado	Sectorial	270.470.000	20.800.000	128.270.000	119.400.000	2.000.000	106.470.000	83,0%
<b>Total Dirección de Obras Hidráulicas</b>							<b>2.880.187.122</b>	<b>367.465.443</b>	<b>2.176.964.440</b>	<b>324.931.550</b>	<b>10.825.689</b>	<b>1.940.319.372</b>	<b>89,1%</b>
Dirección de Promoción de Exportaciones	946044	Visita Feria Fancy Food Nueva York para Aceituna de Mesa	Transf.Corrientes al Sector Privado (24.01)	Regional	Silvoagropecuario	Sectorial	7.412.898	-	7.412.898	-	-	-	0,0%
	946189	Prospección Mercado para el Aceite de Oliva	Transf.Corrientes al Sector Privado (24.01)	Regional	Silvoagropecuario	Sectorial	1.284.936	-	1.284.936	-	-	1.189.175	92,5%
	946191	Prospección de mercado para fibras finas de Vicuña, Alpaca y Llama en el mercado textil chino	Transf.Corrientes al Sector Privado (24.01)	Regional	Silvoagropecuario	Sectorial	4.722.454	-	4.722.454	-	-	4.327.873	91,6%
<b>Total Dirección de Promoción de Exportaciones</b>							<b>13.420.288</b>	<b>-</b>	<b>13.420.288</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5.517.048</b>	<b>41,1%</b>
Dirección General de Aguas	(en blanco)	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE ESTACION FLUVIOMETRICA CAMARONES EN CHILPE	Proyectos (31.02)	Regional	Multisectorial	Sectorial	29.994.915	-	30.000.000	-	5.085	29.994.915	100,0%
<b>Total Dirección General de Aguas</b>							<b>29.994.915</b>	<b>-</b>	<b>30.000.000</b>	<b>-</b>	<b>5.085</b>	<b>29.994.915</b>	<b>100,0%</b>
Dirección Obras Portuarias	30063353-0	ESTUDIO EN MODELO MATEMÁTICO Y FÍSICO DE LA DESEMBOCADURA DEL RIO SAN JOSÉ, ARICA I REGIÓN CONSERVACION Y REPARACION DE LA RED SUBTERRANEA DE AGUA POTABLE DEL SITIO 7 MUELLE AL SERVICIO DEL PERU	Estudios Básicos (31.01)	Comunal (Arica)	Multisectorial	Sectorial	149.085.220	80.819.760	68.265.460	-	-	68.265.460	100,0%
	30083542-0	PUERTO DE ARICA COMUNA DE ARICA XV REGION ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL DE LA OBRA	Proyectos (31.02)	Comunal (Arica)	Agua Potable y Alcantarillado	Sectorial	28.300.402	-	28.300.402	-	-	28.300.402	100,0%
	30084867-0	MEJORAMIENTO BALNEARIO LA LISERA ARICA	Proyectos (31.02)	Comunal (Arica)	Multisectorial	Sectorial	32.510.500	-	32.510.500	-	-	32.510.500	100,0%
	30084940-0	MEJORAMIENTO BALNEARIO LA LISERA, ARICA Reposición y reparación del tendido eléctrico subterráneo del Sitio 7, muelle al Servicio del Perú, Puerto de Arica, comuna de Arica, XV Región	Proyectos (31.02)	Comunal (Arica)	Multisectorial	Sectorial	821.125.957	-	821.125.957	-	-	821.125.957	100,0%
<b>Total Dirección Obras Portuarias</b>							<b>1.093.193.120</b>	<b>80.819.760</b>	<b>1.012.373.360</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.012.373.360</b>	<b>100,0%</b>
Dirección Vialidad	30076562-0	Asesoría Inspección Técnica Contratos Globales 2008-2009-2010; Provincia de Arica y Parinacota Región de Arica y Parinacota	Proyectos (31.02)	Regional	Multisectorial	Sectorial	315.612.000	-	78.903.000	236.709.000	-	13.150.500	16,7%
	30078641-0	Conservación Global de Caminos de las Redes Basica, Comunal Primaria y Comunal Secundaria de las Comunas de Putre y General Lagos; Provincia de Parina Conservación de la Red Vial Comunal; Conservación Periódica: Ruta A-35 Acceso a Codpa Km 40 al Km 47; y Ruta A-35, Sector Acceso a Timar, Km. 69,420	Proyectos (31.02)	Provincial (Parinacota)	Multisectorial	Sectorial	1.507.856.252	-	314.136.803	1.193.719.449	-	345.961.506	110,1%
	30081008-0	Conservación de Obras de Saneamiento Ruta A-35; Sector Belén - Zapahuira; Provincia de Parinacota, Región de Arica y Parinacota. Conservación Obras de Saneamiento Ruta A-23, Pacollo - Alcerrecra, Km 35,000; Provincia de Parinacota, Región de Arica y Parinacota.	Proyectos (31.02)	Comunal (Camarones)	Multisectorial	Sectorial	926.057.051	241.348.445	684.708.606	-	-	684.708.606	100,0%
	30081325-0	Conservación Obras de Saneamiento Ruta A-339, Sector Quebrada de Azapa; Provincia de Arica, Región de Arica y Parinacota.	Proyectos (31.02)	Provincial (Parinacota)	Multisectorial	Sectorial	1.113.000.000	-	1.113.000.000	-	-	1.056.839.426	95,0%
	30081325-0	CONSERVACION PERIODICA RUTA A-315 SECTOR CODPA-GUAÑACAGUA Y RUTA A-35 SECTOR CODPA - CERRO BLANCO, PROVINCIA DE ARICA; REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA CONSERVACION SALIDAS DE EMERGENCIA RUTA 5 SECTOR CUESTA CHACA SUR KM. 2009,0 AL 2024,0; PROVINCIA DE ARICA, REGION DE ARICA Y PARINACOTA	Proyectos (31.02)	Provincial (Arica)	Multisectorial	Sectorial	780.000.000	-	780.000.000	-	-	852.239.603	109,3%
	30081377-0	Conservación Global de Caminos de las Redes Basica, Comunal Primaria y Comunal Secundaria de las Comunas de Arica y Camarones; Provincia de Arica.	Proyectos (31.02)	Provincial (Arica)	Multisectorial	Sectorial	936.000.000	-	936.000.000	-	-	922.130.517	98,5%
	30081377-0	Conservación Global de Caminos de las Redes Basica, Comunal Primaria y Comunal Secundaria de las Comunas de Arica y Camarones; Provincia de Arica.	Transf.Corrientes al Sector Privado (24.01)	Regional	Multisectorial	Sectorial	749.000.000	-	749.000.000	-	-	-	0,0%
	30081377-0	Conservación Global de Caminos de las Redes Basica, Comunal Primaria y Comunal Secundaria de las Comunas de Arica y Camarones; Provincia de Arica.	Transf.Corrientes al Sector Privado (24.01)	Provincial (Arica)	Multisectorial	Sectorial	1.420.000.000	-	350.000.000	1.070.000.000	-	262.469.276	75,0%

Unidad Técnica	Código	Nombre de la Iniciativa	Item Presupuestario	Ubicación Geográfica	Sector	Fuente Financiamiento	Valores							
							Suma de Costo Ajustado	Suma de Gastado Años Anteriores	Suma de Solicitado	Suma de Saldo Próximos Año	Suma de Saldo Años Restantes	Suma de Inv. Ejecutada a Dic. 2009	Suma de Porcentaje Ejecución a Dic. 2009	
Dirección Vialidad	30081377-0	Conservación Global de Caminos Sector Urbano de Arica y Valle de Azapa, Comuna de Arica, Provincia de Arica, Región de Arica y Parinacota, Etapa I	Proyectos (31.02)	Comunal (Arica)	Multisectorial	Sectorial	517.200.000	-	215.500.000	301.700.000	-	60.000.000	27,8%	
	30087914-0	Conservación de los Puentes Chaca, Chaquita y Camarones. Provincia de Arica, Región de Arica y Parinacota.	Proyectos (31.02)	Regional	Multisectorial	Sectorial	574.000.000	-	478.300.000	95.700.000	-	181.583.817	38,0%	
<b>Total Dirección Vialidad</b>							<b>9.193.725.303</b>	<b>241.348.445</b>	<b>6.054.548.409</b>	<b>2.897.828.449</b>	<b>-</b>	<b>4.463.776.628</b>	<b>73,7%</b>	
Fondo Nacional de ayuda a los discapacitados	(en blanco)	FONDO NACIONAL DE PROYECTOS	Transf.Corrientes al Sector Privado (24.01)	Regional	Salud	Sectorial	17.527.324	13.145.493	4.381.831	-	-	-	0,0%	
		FONDO NACIONAL DE PROYECTOS DE ESTRATEGIAS INCLUSIVAS PROGRAMA DE APOYO AL PROCESO EDUCATIVO DE ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD	Transf.Corrientes al Sector Privado (24.01)	Regional	Salud	Sectorial	20.646.804	-	20.646.804	-	-	18.476.057	89,5%	
		PROGRAMA DE AYUDAS TECNICAS	Transf.Corrientes al Sector Privado (24.01)	Regional	Salud	Sectorial	25.929.741	-	25.929.741	-	-	25.929.741	100,0%	
			Transf.Corrientes al Sector Privado (24.01)	Regional	Salud	Sectorial	306.985.000	-	306.985.000	-	-	99.012.262	32,3%	
<b>Total Fondo Nacional de ayuda a los discapacitados</b>							<b>371.088.869</b>	<b>13.145.493</b>	<b>357.943.376</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>143.418.060</b>	<b>40,1%</b>	
Gendarmería de Chile, Dirección Regional	30082252	CONSTRUCCION COMPLEJO PENITENCIARIO FEMENINO DE ARICA	Proyectos (31.02)	Comunal (Arica)	Justicia	Sectorial	190.737.000	-	190.737.000	-	-	-	0,0%	
<b>Total Gendarmería de Chile, Dirección Regional</b>							<b>190.737.000</b>	<b>-</b>	<b>190.737.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,0%</b>	
Instituto de Desarrollo Agropecuario	(en blanco)	Bono de producción PRUM Arica	Transf.Corrientes al Sector Privado (24.01)	Regional Provincial	Silvoagropecuario	Sectorial	2.000.000	-	2.000.000	-	-	1.000.000	50,0%	
		Bono de Produccion PRUM Parinacota	Transf.Corrientes al Sector Privado (24.01)	Regional Provincial (Parinacota)	Silvoagropecuario	Sectorial	300.000	-	300.000	-	-	300.000	100,0%	
		Centros de Gestion Empresarial (CEGES)	Transf.Corrientes al Sector Privado (24.01)	Regional Provincial	Silvoagropecuario	Sectorial	26.024.000	-	26.024.000	-	-	13.012.000	50,0%	
		Concejo Asesor de Area (CADA) Oficina Arica	Transf.Corrientes al Sector Privado (24.01)	Regional Provincial (Arica)	Silvoagropecuario	Sectorial	1.000.000	-	1.000.000	-	-	514.999	51,5%	
		Concejo Asesor de Area (CADA) Oficina Parinacota	Transf.Corrientes al Sector Privado (24.01)	Regional Provincial (Parinacota)	Silvoagropecuario	Sectorial	1.000.000	-	1.000.000	-	-	720.000	72,0%	
		Concejo Asesor Regional (CAR) de INDAP	Transf.Corrientes al Sector Privado (24.01)	Regional	Silvoagropecuario	Sectorial	9.739.400	-	9.739.400	-	-	4.452.784	45,7%	
		Contraloría Social obras de riego	Transf.Corrientes al Sector Privado (24.01)	Regional	Silvoagropecuario	Sectorial	400.000	-	400.000	-	-	-	0,0%	
		CONTRALORIA SOCIAL PRODESAL ARICA - PARINACOTA	Transf.Corrientes al Sector Privado (24.01)	Regional	Silvoagropecuario	Sectorial	872.000	-	872.000	-	-	-	0,0%	
		Convenio INDAP-PRODEMU Arica	Transf.Corrientes al Sector Privado (24.01)	Regional	Silvoagropecuario	Sectorial	6.300.000	-	6.300.000	-	-	1.950.000	31,0%	
		Convenios con Universidades Tesis	Transf.Corrientes al Sector Privado (24.01)	Regional Provincial	Silvoagropecuario	Sectorial	996.600	-	996.600	-	-	996.600	100,0%	
		Credito de Fomento Corto Plazo ARICA	Prestamos De Fomento (32.04)	Regional Provincial (Arica)	Silvoagropecuario	Sectorial	539.559.000	-	539.559.000	-	-	498.119.940	92,3%	
		Credito de Fomento Corto Plazo Parinacota	Prestamos De Fomento (32.04)	Regional Provincial (Parinacota)	Silvoagropecuario	Sectorial	36.664.000	-	36.664.000	-	-	18.050.000	49,2%	
		Credito de Fomento Largo Plazo PARINACOTA	Prestamos De Fomento (32.04)	Regional Provincial (Parinacota)	Silvoagropecuario	Sectorial	24.535.473	-	24.535.473	-	-	9.882.602	40,3%	
		Credito Fomento Largo Plazo ARICA	Prestamos De Fomento (32.04)	Regional Provincial (Arica)	Silvoagropecuario	Sectorial	133.236.527	-	133.236.527	-	-	102.179.071	76,7%	
		Credito Fondo Rotatorio Obras Asociativas Riego Arica	Transf.Corrientes al Sector Privado (24.01)	Regional Provincial (Arica)	Silvoagropecuario	Sectorial	84.879.880	-	84.879.880	-	-	70.752.208	83,4%	
		Escuela de Turismo	Transf.Corrientes al Sector Privado (24.01)	Regional	Silvoagropecuario	Sectorial	3.920.000	-	3.920.000	-	-	1.960.000	50,0%	
		Expo Mundo Rural	Transf.Corrientes al Sector Privado (24.01)	Regional Provincial	Silvoagropecuario	Sectorial	13.871.308	-	13.871.308	-	-	6.935.654	50,0%	
		Incentivo a la Conservación de suelos (SIRS) PARINACOTA	Transf.Corrientes al Sector Privado (24.01)	Regional Provincial (Parinacota)	Silvoagropecuario	Sectorial	26.316.221	-	26.316.221	-	-	24.562.861	93,3%	
		Incentivo a la Inversión Agrícola en Arica	Transf.Corrientes al Sector Privado (24.01)	Regional Provincial (Arica)	Silvoagropecuario	Sectorial	126.414.707	-	126.414.707	-	-	102.448.194	81,0%	
		Incentivo a la Inversión en Praderas (SIRS) ARICA	Transf.Corrientes al Sector Privado (24.01)	Regional Provincial (Arica)	Silvoagropecuario	Sectorial	13.396.388	-	13.396.388	1.965.530	-	1.965.530	11.430.858	85,3%
		Incentivo a la Inversión en Praderas (SIRS) PARINACOTA	Transf.Corrientes al Sector Privado (24.01)	Regional Provincial (Parinacota)	Silvoagropecuario	Sectorial	11.069.000	-	11.069.000	-	-	11.069.000	100,0%	
		Incentivo a la inversión en rehabilitación de suelos (SIRS) ARICA	Transf.Corrientes al Sector Privado (24.01)	Regional Provincial (Arica)	Silvoagropecuario	Sectorial	2.073.157	-	2.073.157	-	-	1.240.820	59,9%	

Unidad Técnica	Código	Nombre de la Iniciativa	Item Presupuestario	Ubicación Geográfica	Sector	Fuente Financiamiento	Valores					Suma de Inv. Ejecutada a Dic. 2009	Suma de Porcentaje Ejecución a Dic. 2009
							Suma de Costo Ajustado	Suma de Gastado Años Anteriores	Suma de Solicitado	Suma de Saldo Próximos Año	Suma de Saldo Años Restantes		
		Incentivo a la inversión en rehabilitación de suelos (SIRS) PARINACOTA	Transf. Corrientes al Sector Privado (24.01)	Provincial (Parinacota)	Silvoagropecuario	Sectorial	180.970	-	180.970	-	-	170.001	93,9%
		Incentivo a la Inversión PDI riego Arica	Transf. Corrientes al Sector Privado (24.01)	Provincial (Arica)	Silvoagropecuario	Sectorial	46.946.110	-	46.946.110	-	-	42.730.313	91,0%
		Incentivo a la Inversión Pecuaría Camarones Arica	Transf. Corrientes al Sector Privado (24.01)	Provincial (Arica)	Silvoagropecuario	Sectorial	16.041.382	-	16.041.382	-	-	9.593.311	59,8%
		Incentivo de riego Obras extraprediales Arica	Transf. Corrientes al Sector Privado (24.01)	Provincial (Arica)	Silvoagropecuario	Sectorial	97.054.520	-	97.054.520	-	-	37.428.170	38,6%
		Incentivo de riego Obras extraprediales Parinacota	Transf. Corrientes al Sector Privado (24.01)	Comunal (Parinacota)	Silvoagropecuario	Sectorial	20.404.271	-	20.404.271	-	-	17.229.752	84,4%
		Incentivo Fortalecimiento Productivo PRODESAL ARICA	Transf. Corrientes al Sector Privado (24.01)	Provincial (Camarones)	Silvoagropecuario	Sectorial	12.291.046	-	12.291.046	-	-	11.428.707	93,0%
		Incentivo Inversión Agrícola PDI Parinacota	Transf. Corrientes al Sector Privado (24.01)	Provincial (Parinacota)	Agua Potable y Alcantarillado	Sectorial	8.312.770	-	8.312.770	-	-	7.863.570	94,6%
		Incentivo Obras Menores de Riego Arica	Transf. Corrientes al Sector Privado (24.01)	Regional Provincial	Silvoagropecuario	Sectorial	28.000.000	-	28.000.000	-	-	11.947.358	42,7%
		Incentivo para estudios técnicos de preinversión Ley 18.450 Arica	Transf. Corrientes al Sector Privado (24.01)	Provincial (Arica)	Silvoagropecuario	Sectorial	10.000.000	-	10.000.000	-	-	1.726.053	17,3%
		Incentivo para estudios técnicos de preinversión Ley 18.450 Parinacota	Transf. Corrientes al Sector Privado (24.01)	Provincial (Parinacota)	Silvoagropecuario	Sectorial	2.000.000	-	2.000.000	-	-	-	0,0%
		Incentivo Riego convenio Indap - Conadi	Transf. Corrientes al Sector Privado (24.01)	Regional Provincial	Silvoagropecuario	Sectorial	7.000.000	-	7.000.000	-	-	7.000.000	100,0%
		Incentivo Riego Obras Menores Parinacota	Transf. Corrientes al Sector Privado (24.01)	Provincial (Parinacota)	Agua Potable y Alcantarillado	Sectorial	10.000.000	-	10.000.000	-	-	7.458.373	74,6%
		Inversión Fortalecimiento Organizacional PRODES Parinacota	Transf. Corrientes al Sector Privado (24.01)	Provincial (Parinacota)	Silvoagropecuario	Sectorial	2.200.000	-	2.200.000	-	-	2.200.000	100,0%
		Inversión Fortalecimiento Productivo PRODESAL Parinacota	Transf. Corrientes al Sector Privado (24.01)	Provincial (Parinacota)	Silvoagropecuario	Sectorial	10.970.439	-	10.970.439	-	-	9.356.668	85,3%
		Inversión Pecuaría Putre	Transf. Corrientes al Sector Privado (24.01)	Provincial (Parinacota)	Silvoagropecuario	Sectorial	13.949.656	-	13.949.656	-	-	2.191.455	15,7%
		Mujer Rural (Programa de Desarrollo de Segmentos Especiales) Arica	Transf. Corrientes al Sector Privado (24.01)	Provincial (Arica)	Silvoagropecuario	Sectorial	2.435.000	-	2.435.000	-	-	-	0,0%
		Mujer Rural PARINACOTA	Transf. Corrientes al Sector Privado (24.01)	Provincial (Parinacota)	Silvoagropecuario	Sectorial	565.000	-	565.000	-	-	565.000	100,0%
		Otras asesorías SAT Otras Asesorías Técnicas Arica	Transf. Corrientes al Sector Privado (24.01)	Comunal (Arica)	Silvoagropecuario	Sectorial	31.640.555	-	31.640.555	-	-	6.272.391	19,8%
		Otras Asesorías Técnicas Parinacota	Transf. Corrientes al Sector Privado (24.01)	Comunal (Putre)	Silvoagropecuario	Sectorial	13.514.791	-	13.514.791	-	-	3.603.916	26,7%
		Programa Chile Emprende	Transf. Corrientes al Sector Privado (24.01)	Comunal (Arica)	Silvoagropecuario	Sectorial	1.200.000	-	1.200.000	-	-	-	0,0%
		Programa de Acceso digital para la conectividad a Internet y Equipamiento Computacional	Transf. Corrientes al Sector Privado (24.01)	Comunal (Camarones)	Silvoagropecuario	Sectorial	7.078.000	-	7.078.000	-	-	-	0,0%
		Programa de Desarrollo de Organizaciones Productivas (PRODES)	Transf. Corrientes al Sector Privado (24.01)	Provincial (Arica)	Silvoagropecuario	Sectorial	6.375.000	-	6.375.000	-	-	5.668.000	88,9%
		Programa de Desarrollo Indígena Mideplan	Transf. Corrientes al Sector Privado (24.01)	Regional Comunal	Silvoagropecuario	Sectorial	65.000.000	-	65.000.000	-	-	-	0,0%
		Programa de Desarrollo Local (PRODESAL) Camarones Arica	Transf. Corrientes al Sector Privado (24.01)	Comunal (Camarones)	Silvoagropecuario	Sectorial	22.095.309	-	22.095.309	-	-	22.095.309	100,0%
		Programa de Desarrollo Local (PRODESAL) General Lagos	Transf. Corrientes al Sector Privado (24.01)	Comunal (Lagos)	Silvoagropecuario	Sectorial	17.654.896	-	17.654.896	-	-	17.654.896	100,0%
		Programa de Desarrollo Local (PRODESAL) Putre	Transf. Corrientes al Sector Privado (24.01)	Comunal (Putre)	Silvoagropecuario	Sectorial	35.309.794	-	35.309.794	-	-	35.309.794	100,0%
		Programa de Integración de Empresas Campesinas en redes Por Rubros	Transf. Corrientes al Sector Privado (24.01)	Regional	Silvoagropecuario	Sectorial	12.000.000	-	12.000.000	-	-	-	0,0%
		Programa Nacional de Acceso Digital Para la Agricultura Familiar Campesina	Transf. Corrientes al Sector Privado (24.01)	Regional	Silvoagropecuario	Sectorial	8.500.000	-	8.500.000	-	-	4.047.368	47,6%
		Programa Orígenes	Transf. Corrientes al Sector Privado (24.01)	Regional Provincial	Silvoagropecuario	Sectorial	13.699.000	-	13.699.000	-	-	10.813.200	78,9%
		Regularización de derechos de Aguas Arica	Transf. Corrientes al Sector Privado (24.01)	Provincial (Arica)	Silvoagropecuario	Sectorial	19.988.862	-	19.988.862	-	-	-	0,0%
		regularización de derechos de aguas Parinacota	Transf. Corrientes al Sector Privado (24.01)	Provincial (Parinacota)	Silvoagropecuario	Sectorial	4.376.237	-	4.376.237	-	-	1.400.000	32,0%

Unidad Técnica	Código	Nombre de la Iniciativa	Item Presupuestario	Ubicación Geográfica	Sector	Fuente Financiamiento	Valores							
							Suma de Costo Ajustado	Suma de Gastado Años Anteriores	Suma de Solicitado	Suma de Saldo Próximos Año	Suma de Saldo Años Restantes	Suma de Inv. Ejecutada a Dic. 2009	Suma de Porcentaje Ejecución a Dic. 2009	
		Servicio de Asesorías Técnicas (SAT) Predial	Transf. Corrientes al Sector Privado (24.01)	Provincial (Arica)	Comunicaciones	Sectorial	38.613.384	-	38.613.384	-	-	20.078.959	52,0%	
		SIRSD. Conservacion de Suelos Arica	Transf. Corrientes al Sector Privado (24.01)	Provincial (Arica)	Silvoagropecuario	Sectorial	19.336.252	-	19.336.252	-	-	15.352.946	79,4%	
<b>Total Instituto de Desarrollo Agropecuario</b>							<b>1.669.300.905</b>	<b>-</b>	<b>1.669.300.905</b>	<b>1.965.530</b>	<b>-</b>	<b>1.965.530</b>	<b>1.192.763.101</b>	<b>71,5%</b>
Instituto Nacional del Deporte	30086484-0	MEJORAMIENTO ESTADIO CARLOS DITTBORN DIFUSION CAMPEONATO MUNDIAL DE SURF ARICA PRO	Transf. Corrientes a Otras Ent. Públicas	Regional	Deportes	Sectorial	4.000.000.000	-	4.000.000.000	-	-	2.500.000.000	62,5%	
	30088985-0	CHALLENGE-CHILE CONCURSO PUBLICO FONDEPORTE 2009 - DEPORTE	Transf. Corrientes al Sector Privado (24.01)	Regional	Deportes	Sectorial	-	-	25.000.000	-	25.000.000	25.000.000	100,0%	
	(en blanco)	COMPETITIVO CONCURSO PUBLICO FONDEPORTE 2009 - DEPORTE	Transf. Corrientes al Sector Privado (24.01)	Regional	Deportes	Sectorial	92.102.000	-	92.102.000	-	-	81.980.130	89,0%	
		FORMATIVO CONCURSO PUBLICO FONDEPORTE 2009 - DEPORTE	Transf. Corrientes al Sector Privado (24.01)	Regional	Deportes	Sectorial	156.049.000	-	156.049.000	-	-	155.912.100	99,9%	
		RECREATIVO CONCURSO PUBLICO FONDEPORTE 2009 - DEPORTE	Transf. Corrientes al Sector Privado (24.01)	Regional	Deportes	Sectorial	87.256.000	-	87.256.000	-	-	86.833.580	99,5%	
		CONCURSO PUBLICO FONDEPORTE 2009 . AREA DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	Transf. Corrientes al Sector Privado (24.01)	Regional	Deportes	Sectorial	15.079.122	-	-	15.079.122	-	-	#iDIV/O!	
		CORPORACIONES MUNICIPALES DE DEPORTE	Transf. Corrientes al Sector Privado (24.01)	Regional	Deportes	Sectorial	15.668.000	-	15.668.000	-	-	10.503.790	67,0%	
		MEJOR CALIDAD DE VIDA - JOVENES EN RIESGO SOCIAL	Transf. Corrientes al Sector Privado (24.01)	Regional	Deportes	Sectorial	24.788.000	-	24.788.000	-	-	24.206.755	97,7%	
		MEJOR CALIDAD DE VIDA - MUJERES DUEÑAS DE CASA EN EL DEPORTE	Transf. Corrientes al Sector Privado (24.01)	Regional	Deportes	Sectorial	37.146.000	-	-	37.146.000	-	-	#iDIV/O!	
		POSICIONAMIENTO DEL ALTO RENDIMIENTO - CENTRO DE ENTRENAMIENTO REGIONAL	Transf. Corrientes al Sector Privado (24.01)	Regional	Deportes	Sectorial	35.982.000	-	35.982.000	-	-	31.408.718	87,3%	
		PROGRAMA 1000 ESCUELAS DE FUTBOL RECINTOS Y ESPACIOS PUBLICOS ABIERTOS A LA COMUNIDAD - ESCUELAS ABIERTAS ALA COMUNIDAD	Transf. Corrientes al Sector Privado (24.01)	Regional	Deportes	Sectorial	3.600.000	-	3.600.000	-	-	3.600.000	100,0%	
			Transf. Corrientes al Sector Privado (24.01)	Regional	Deportes	Sectorial	35.051.000	-	35.051.000	-	-	34.462.239	98,3%	
<b>Total Instituto Nacional del Deporte</b>							<b>4.502.721.122</b>	<b>-</b>	<b>4.475.496.000</b>	<b>52.225.122</b>	<b>-</b>	<b>25.000.000</b>	<b>2.953.907.312</b>	<b>66,0%</b>
Secretaría de Transporte	30071230	Actualización Diagnóstico del S.T.U. de la ciudad de Arica	Estudios Básicos	Comunal	Transporte	Sectorial	219.405.000	-	87.762.000	131.643.000	-	43.881.000	50,0%	
	30075678	Mejoramiento Par Vial Juan Noé-Chacabuco, Arica	Proyectos (31.02)	Comunal	Transporte	Sectorial	104.000.000	-	15.600.000	88.400.000	-	-	0,0%	
<b>Total Secretaría de Transporte</b>							<b>323.405.000</b>	<b>-</b>	<b>103.362.000</b>	<b>220.043.000</b>	<b>-</b>	<b>43.881.000</b>	<b>42,5%</b>	
Seremi de Educación	(en blanco)	FONDO DE APOYO AL MEJORAMIENTO DE LA GESTION MUNICIPAL EN EDUCACION 2009 - ARICA	Transf. de Capital A Otras Ent. Públicas	Comunal (Arica)	Educación y Cultura	Sectorial	322.819.176	-	322.819.176	-	-	161.409.588	50,0%	
		FONDO DE APOYO AL MEJORAMIENTO DE LA GESTION MUNICIPAL EN EDUCACION 2009 - CAMARONES	Transf. de Capital A Otras Ent. Públicas	Comunal (Camarones)	Educación y Cultura	Sectorial	63.420.931	-	63.420.931	-	-	31.710.000	50,0%	
		FONDO DE APOYO AL MEJORAMIENTO DE LA GESTION MUNICIPAL EN EDUCACION 2009 - GRAL. LAGOS	Transf. de Capital A Otras Ent. Públicas	Comunal (Lagos)	Educación y Cultura	Sectorial	71.450.760	-	71.450.760	-	-	35.725.380	50,0%	
		FONDO DE APOYO AL MEJORAMIENTO DE LA GESTION MUNICIPAL EN EDUCACION 2009 - PUTRE	Transf. de Capital A Otras Ent. Públicas	Comunal (Putre)	Educación y Cultura	Sectorial	50.063.270	-	50.063.270	-	-	25.031.635	50,0%	
<b>Total Seremi de Educación</b>							<b>507.754.137</b>	<b>-</b>	<b>507.754.137</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>253.876.603</b>	<b>50,0%</b>	
Seremi de Minería	(en blanco)	Programa de Asistencia a la Pequeña Minería	Transf. Corrientes al Sector Privado (24.01)	Comunal (Arica, Camarones, Putre)	Minería	Sectorial	32.582.411	-	32.582.411	-	-	32.582.411	100,0%	
<b>Total Seremi de Minería</b>							<b>32.582.411</b>	<b>-</b>	<b>32.582.411</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>32.582.411</b>	<b>100,0%</b>	
Seremi de Salud	212229-15	Plan Regional de Salud Pública Región de Arica y Parinacota	Transf. Corrientes al Sector Privado (24.01)	Regional	Salud	Sectorial	236.309.275	-	236.309.275	-	-	232.523.116	98,4%	
<b>Total Seremi de Salud</b>							<b>236.309.275</b>	<b>-</b>	<b>236.309.275</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>232.523.116</b>	<b>98,4%</b>	
Servicio Agrícola y Ganadero	2401404	PROGRAMA DE RECUPERACION DE SUELOS DEGRADADOS	Transf. Corrientes al Sector Privado (24.01)	Regional	Silvoagropecuario	Sectorial	119.837.521	-	119.837.521	-	-	119.837.521	100,0%	
	2401407	FONDO DE MEJORAMIENTO DEL PATRIMONIO SANITARIO	Transf. Corrientes al Sector Privado (24.01)	Regional	Silvoagropecuario	Sectorial	982.890	-	982.890	-	-	982.890	100,0%	
<b>Total Servicio Agrícola y Ganadero</b>							<b>120.820.411</b>	<b>-</b>	<b>120.820.411</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>120.820.411</b>	<b>100,0%</b>	
Servicio de Cooperación Técnica	(en blanco)	Centros de Emprendimiento y Puntos de Atención MIPE.	Transf. Corrientes al Sector Privado (24.01)	Regional	Ind., Com., Fzas. y Turismo	Sectorial	10.000.000	-	10.000.000	-	-	10.000.000	100,0%	
		Feria Expo Pyme 2009	Transf. Corrientes al Sector Privado (24.01)	Regional	Ind., Com., Fzas. y Turismo	Sectorial	17.560.000	-	17.560.000	-	-	17.560.000	100,0%	
		Fondo Concursable Capital Semilla para Emprendedores	Transf. Corrientes al Sector Privado (24.01)	Regional	Multisectorial	Sectorial	134.500.000	-	134.500.000	-	-	134.500.000	100,0%	

Unidad Técnica	Código	Nombre de la Iniciativa	Item Presupuestario	Ubicación Geográfica	Sector	Fuente Financiamiento	Valores						
							Suma de Costo Ajustado	Suma de Gastado Años Anteriores	Suma de Solicitado	Suma de Saldo Próximos Año	Suma de Saldo Años Restantes	Suma de Inv. Ejecutada a Dic. 2009	Suma de Porcentaje Ejecución a Dic. 2009
Servicio de Cooperación Técnica	(en blanco)	Fondo Concursable Capital Semilla versión empresas	Transf. de Capital Al Sector Privado (33.01)	Regional Comunal	Multisectorial Ind., Com., Fzas. y Turismo	Sectorial	126.000.000	-	126.000.000	-	-	126.000.000	100,0%
		Fondo concursable de Ferias Libres Región de Arica Y Parinacota	Transf.Corrientes al Sector Privado (24.01)	(Arica) Comunal		Sectorial	8.000.000	-	8.000.000	-	-	8.000.000	100,0%
		Programa Chileemprende Territorio de Arica	Transf.Corrientes al Sector Privado (24.01)	(Camarones) Provincial	Multisectorial	Sectorial	20.000.000	-	20.000.000	-	-	20.000.000	100,0%
		Programa Chileemprende territorio de Parinacota	Transf. de Capital Al Sector Privado (24.01)	(Parinacota)	Multisectorial	Sectorial	18.000.000	-	18.000.000	-	-	18.000.000	100,0%
		Programa de Capital Semilla Empresa ( medida presidencial)	Transf.Corrientes al Sector Privado (33.01)	Regional Provincial	Multisectorial Ind., Com., Fzas. y Turismo	Sectorial	97.200.000	-	97.200.000	-	-	97.200.000	100,0%
		Programa de Entorno, para Cooperativa Multiactiva MiPe Arica S.A	Transf.Corrientes al Sector Privado (24.01)	(Arica)		Sectorial	15.000.000	-	15.000.000	-	-	15.000.000	100,0%
		Programa de Generación de competencias para mujeres emprendedoras y Empresarias	Transf.Corrientes al Sector Privado (24.01)	Regional	Multisectorial	Sectorial	4.000.000	-	4.000.000	-	-	4.000.000	100,0%
		Programa Microempresas	Transf.Corrientes al Sector Privado (24.01)	Regional	Multisectorial	Sectorial	45.000.000	-	45.000.000	-	-	45.000.000	100,0%
		Programas de apoyo virtuales (Gondola de Servicios) y presenciales ( Talleres Redes) para las Mipes de la Región.	Transf.Corrientes al Sector Privado (24.01)	Regional	Multisectorial	Sectorial	10.400.000	-	10.400.000	-	-	10.400.000	100,0%
<b>Total Servicio de Cooperación Técnica</b>							<b>505.660.000</b>	<b>-</b>	<b>505.660.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>505.660.000</b>	<b>100,0%</b>
Servicio de Salud	20101828	NORMALIZACION HOSPITAL DE ARICA	Proyectos (31.02)	Comunal	Salud	Sectorial	31.751.038.293	11.540.107.009	8.683.274.000	2.639.966.284	8.887.691.000	7.979.821.498	91,9%
	30047599	NORMALIZACION HOSPITAL ARICA-COMPONENTE CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD FAMILIAR SECTOR NORTE,	Proyectos (31.02)	Comunal	Salud	Sectorial	5.714.599.000	999.454.000	664.764.000	2.173.301.000	1.877.080.000	663.799.016	99,9%
	30067564	COMUNA ARICA	Proyectos (31.02)	(Arica)	Salud	Sectorial	2.388.562.000	-	861.000.000	1.527.562.000	-	-	0,0%
<b>Total Servicio de Salud</b>							<b>39.854.199.293</b>	<b>12.539.561.009</b>	<b>#####</b>	<b>6.340.829.284</b>	<b>10.764.771.000</b>	<b>8.643.620.514</b>	<b>84,7%</b>
Servicio de Vivienda y Urbanización	30003711-0	Normalización y Mejoramiento Perfil Maipú - 18 de Sept. y conexiones, Arica (Etapa 2)	Proyectos (31.02)	Comunal (Arica)	Transporte Vivienda	Sectorial	251.374.000	-	251.374.000	-	-	-	0,0%
		TRANSFERENCIA ASISTENCIA TECNICA PLANES DE GESTIÓN SOCIAL Y DE OBRA	Proyectos (31.02)	Comunal (Arica)	Vivienda	Sectorial	251.374.000	-	251.374.000	-	-	221.000	0,1%
	30074297-0	CONSTRUCCION PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS, 17 LLAMADO, MEJORAMIENTO CONDOMINIOS SOCIALES AÑO 2008, 10º	Proyectos (31.02)	Comunal	Vivienda	Sectorial	1.517.642.000	-	1.517.642.000	-	-	786.504.012	51,8%
	30074390-0	LLAMADO CONSTRUCCION PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS, 18	Proyectos (31.02)	Comunal	Vivienda	Sectorial	410.952.027	201.126.027	209.826.000	-	-	197.747.618	94,2%
	30074392-0	LLAMADO CONSTRUCCION PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS, 18	Proyectos (31.02)	(Arica) Comunal	Vivienda	Sectorial	73.303.000	46.076.000	27.227.000	-	-	27.227.000	100,0%
	30080426-0	LLAMADO,ARICA Y PARINACOTA	Proyectos (31.02)	(Arica)	Vivienda	Sectorial	210.543.000	-	67.795.000	-	142.748.000	60.646.843	89,5%
	30083557-0	CONSERVACION EDIFICIO SERVIU ARICA Y PARINACOTA, ARICA	Proyectos (31.02)	Comunal	Vivienda	Sectorial	179.096.000	-	179.096.000	-	-	114.161.206	63,7%
	30085181-0	CONSERVACION VIVIENDAS SERVIU ADULTO MAYOR 2009	Proyectos (31.02)	Comunal	Vivienda	Sectorial	6.345.000	-	6.345.000	-	-	6.161.000	97,1%
	30086354-0	CONSTRUCCION CENTRO LARGA ESTADIA, ADULTO MAYOR,	Proyectos (31.02)	Comunal	Vivienda	Sectorial	256.076.000	-	84.205.000	171.282.000	589.000	291.557	0,3%
<b>Total Servicio de Vivienda y Urbanización</b>							<b>3.156.705.027</b>	<b>247.202.027</b>	<b>2.594.884.000</b>	<b>171.282.000</b>	<b>143.337.000</b>	<b>1.192.960.236</b>	<b>46,0%</b>
Servicio Nacional de Capacitación y Empleo	APRE01	PROGRAMA APRENDIZAJE JÓVENES	Transf. Corrientes al Sector Privado (24.01)	Regional	Multisectorial	Sectorial	312.896.160	-	312.896.160	-	-	295.510.000	94,4%
	BFSC	BECAS FONDO SEGURO DE CESANTÍA	Transf.Corrientes al Sector Privado (24.01)	Regional	Multisectorial	Sectorial	10.080.000	-	10.080.000	-	-	8.720.000	86,5%
	BMYPE	BECAS MYPE	Transf.Corrientes al Sector Privado (24.01)	Regional	Multisectorial	Sectorial	98.952.207	-	98.952.207	-	-	98.952.207	100,0%
	BON01	BONIFICACIÓN A LA CONTRATACIÓN A LA MANO DE OBRA	Transf.Corrientes al Sector Privado (24.01)	Regional	Multisectorial	Sectorial	124.221.148	-	124.221.148	-	-	115.026.800	92,6%
	BONCHISOL 01	BONIFICACION A LA CONTRATACIÓN DE MANO DE OBRA CHILESOLIDARIO	Transf.Corrientes al Sector Privado (24.01)	Regional Provincial	Multisectorial	Sectorial	12.049.600	-	12.049.600	-	-	10.940.000	90,8%
	CH.E. PAR SEM	CHILE EMPRENDE PARINACOTA SEMINARIO	Transf.Corrientes al Sector Privado (24.01)	(Parinacota) Provincial	Multisectorial	Sectorial	3.000.000	-	3.000.000	-	-	3.000.000	100,0%
	CH.E.AR	CHILE EMPRENDE TERRITORIO ARICA	Transf.Corrientes al Sector Privado (24.01)	(Arica) Provincial	Multisectorial	Sectorial	16.500.000	-	16.500.000	-	-	16.500.000	100,0%
	CHIEP09	CHILE EMPRENDE PARINACOTA	Transf.Corrientes al Sector Privado (24.01)	(Parinacota) Provincial	Multisectorial	Sectorial	9.300.000	-	9.300.000	-	-	9.300.000	100,0%
	CAP	CHILE EMPRENDE CAPACITACION PARINACOTA 09	Transf.Corrientes al Sector Privado (24.01)	(Parinacota)	Multisectorial	Sectorial	2.500.000	-	2.500.000	-	-	2.500.000	100,0%
	CHISOL JOV	JÓVENES CHILESOLIDARIO	Transf.Corrientes al Sector Privado (24.01)	Regional Provincial	Multisectorial	Sectorial	7.254.000	-	7.254.000	-	-	636.000	8,8%
	FT01	FRANQUICIA TRIBUTARIA	Transf.Corrientes al Sector Privado (24.01)	(Arica) Comunal	Multisectorial	Sectorial	283.001.681	-	283.001.681	-	-	248.338.836	87,8%
	J-BICENT	JÓVENES BICENTENARIOS	Transf.Corrientes al Sector Privado (24.01)	(Arica)	Multisectorial	Sectorial	159.483.960	-	159.483.960	-	-	138.806.370	87,0%

Unidad Técnica	Código	Nombre de la Iniciativa	Item Presupuestario	Ubicación Geográfica	Sector	Fuente Financiamiento	Valores						
							Suma de Costo Ajustado	Suma de Gastado Años Anteriores	Suma de Solicitado	Suma de Saldo Próximos Año	Suma de Saldo Años Restantes	Suma de Inv. Ejecutada a Dic. 2009	Suma de Porcentaje Ejecución a Dic. 2009
Servicio Nacional de Capacitación y Empleo	LEMYPE	LÍNEA ESPECIAL MYPE	Transf.Corrientes al Sector Privado (24.01)	Regional	Multisectorial	Sectorial	9.600.000	-	9.600.000	-	-	8.565.000	89,2%
	MTRAB	Programa Inversión a la comunidad, Mejor Trabajo	Transf.Corrientes al Sector Privado (24.01)	Regional	Multisectorial	Sectorial	1.339.486.594	-	1.339.486.594	-	-	1.341.035.930	100,1%
	PMJH	PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR	Transf.Corrientes al Sector Privado (24.01)	Regional Comunal	Multisectorial	Sectorial	23.349.250	-	23.349.250	-	-	22.599.250	96,8%
	PNB01	PROGRAMA NACIONAL DE BECAS	Transf.Corrientes al Sector Privado (24.01)	(Arica)	Multisectorial	Sectorial	170.368.667	-	170.368.667	-	-	168.374.860	98,8%
	SLE	SERVICIO LOCAL DE EMPLEO	Transf.Corrientes al Sector Privado (24.01)	Regional	Multisectorial	Sectorial	15.320.755	-	15.320.755	-	-	-	0,0%
	TSP01	TRANSFERENCIA SECTOR PÚBLICO	Transf.Corrientes al Sector Privado (24.01)	Regional	Multisectorial	Sectorial	46.485.216	-	46.485.216	-	-	46.485.216	100,0%
<b>Total Servicio Nacional de Capacitación y Empleo</b>							<b>2.643.849.238</b>	<b>-</b>	<b>2.643.849.238</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2.535.290.469</b>	<b>95,9%</b>
Servicio Nacional de la Mujer	24.15.01.09	CENTRO DE LA MUJER, MODELO DE INTERVENCION COMUNITARIA PARA ABORDAR LA PREVENCIÓN, LA DETECCIÓN E INTERRUPTIÓN TEMPRANA DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR. PROGRAMA MEJORAMIENTO DE LA EMPLEABILIDAD DE	Transf.Corrientes a Otras Ent.Públicas (24.03)	Provincial (Arica)	Multisectorial	Sectorial	48.779.144	-	48.779.144	-	-	48.779.144	100,0%
	24.15.02.09	MUJERES JEFAS DE HOGAR DE LA COMUNA DE ARICA CASA DE ACOGIDA MIRABAL, PARA MUJERES EN RIESGO VITAL,	Transf.Corrientes a Otras Ent.Públicas (24.01)	(Arica)	Multisectorial	Sectorial	14.300.000	-	14.300.000	-	-	14.300.000	100,0%
	24.15.03.09	VÍCTIMAS DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR. PROGRAMA MEJORAMIENTO DE LA EMPLEABILIDAD DE	Transf.Corrientes a Otras Ent.Públicas (24.01)	Regional Comunal	Multisectorial	Sectorial	63.406.518	-	63.406.518	-	-	63.406.518	100,0%
	24.15.04.09	MUJERES JEFAS DE HOGAR DE LA COMUNA DE PUTRE	Transf.Corrientes a Otras Ent.Públicas (24.01)	(Putre)	Multisectorial	Sectorial	6.600.000	-	6.600.000	-	-	6.600.000	100,0%
<b>Total Servicio Nacional de la Mujer</b>							<b>133.085.662</b>	<b>-</b>	<b>133.085.662</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>133.085.662</b>	<b>100,0%</b>
Servicio Nacional de Menores	(en blanco)	Línea de atención Diagnóstico	Transf.Corrientes al Sector Privado (24.01)	Regional	Justicia	Sectorial	173.290.000	-	173.290.000	-	-	152.931.626	88,3%
		Línea de Atención Oficina de Protección de Derechos	Transf.Corrientes al Sector Privado (24.01)	Regional	Justicia	Sectorial	57.298.000	-	57.298.000	-	-	63.048.210	110,0%
		Línea de Atención Programas	Transf.Corrientes al Sector Privado (24.01)	Regional	Justicia	Sectorial	826.854.000	-	826.854.000	-	-	819.878.972	99,2%
		Línea de Atención Residencias	Transf.Corrientes al Sector Privado (24.01)	Regional	Justicia	Sectorial	402.375.000	-	402.375.000	-	-	455.778.073	113,3%
<b>Total Servicio Nacional de Menores</b>							<b>1.459.817.000</b>	<b>-</b>	<b>1.459.817.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.491.636.881</b>	<b>102,2%</b>
Servicio Nacional de Turismo	(en blanco)	Campaña de Promoción Comuna de Camarones	Adquisicion De Activos No Financieros Otros	Comunal (Camarones)	Ind., Com., Fzas. y Turismo	Sectorial	3.000.000	-	1.093.610	-	1.906.390	-	0,0%
		Construcción de medianero entre Sernatur y la Caja de Compensación Los Andes	Transf.Corrientes al Sector Privado (24.01)	Comunal (Arica)	Ind., Com., Fzas. y Turismo	Sectorial	-	-	-	-	-	2.413.112	#DIV/0!
		Desarrollo de una estrategia de Promoción Turística a partir de la Creación de una Oficina de Operación Turística en la ciudad de Santiago	Adquisicion De Activos No Financieros Otros	Comunal (Arica)	Ind., Com., Fzas. y Turismo	Sectorial	18.000.000	-	18.000.000	-	-	-	0,0%
		Fiscalización del Programa Vacaciones Tercera Edad	Transf.Corrientes a Otras Ent.Públicas (24.03)	(Arica, Camarones, Putre)	Ind., Com., Fzas. y Turismo	Sectorial	-	-	880.000	-	880.000	466.050	53,0%
<b>Total Servicio Nacional de Turismo</b>							<b>21.000.000</b>	<b>-</b>	<b>19.973.610</b>	<b>-</b>	<b>1.026.390</b>	<b>2.879.162</b>	<b>14,4%</b>
<b>Total general</b>							<b>73.155.669.773</b>	<b>13.489.542.177</b>	<b>38.754.033.197</b>	<b>10.019.104.935</b>	<b>10.892.989.464</b>	<b>30.334.119.678</b>	<b>78,3%</b>

## **ANEXO II**

---

Detalle avance iniciativas de inversión pública fuente F.N.D.R. por Unidad  
Técnica al 4to. Trimestre (dic.), PROPIR 2009.

ESTADO DE AVANCE 4to. TRIMESTRE PROPRI 2009: FUENTE DE FINANCIAMIENTO F.N.D.R.

Sistema de Gestión de Inversión(Diciembre 2009)

Unidad Técnica	Código	Nombre de la Iniciativa	Item Presupuestario	Ubicación Geográfica	Sector	Fuente Financiamiento	Valores					Suma de Inv. Ejecutada a Dic. 2009	Suma de Porcentaje Ejecución a Dic.
							Suma de Costo Ajustado	Suma de Gastado Años Anteriores	Suma de Solicitado	Suma de Saldo Próximos Año	Suma de Saldo Años Restantes		
Carabineros de Chile	30077018	EQUIPAMIENTO TENENCIA CARRETERA CUYA, ARICA AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO CUARTEL OS7 CARABINEROS	Adquisicion De Activos No Financieros (29)	Comunal (Camarones)	Defensa y Seguridad	Fndr	37.112.000	-	20.674.000	-	16.438.000	12.470.058	60,3%
	30077021	ARICA ADQUISICION VEHICULOS PREFECTURA DE CARABINEROS -	Proyectos (31.02) Adquisicion De Activos No Financieros (29)	Regional	Seguridad	Fndr	11.400.000	-	2.025.000	9.375.000	-	2.025.000	100,0%
	30084776	ARICA	No Financieros (29)	Comunal (Arica)	Seguridad	Fndr	467.515.000	280.260.000	187.255.000	-	-	175.601.000	93,8%
	30084778	ADQUISICION UNIDADES ESPECIALIZADAS PARA UNIDADES Y DESTACAMENTOS -PREFECTURA CARABINEROS ARICA	Adquisicion De Activos No Financieros (29)	Comunal (Arica)	Defensa y Seguridad	Fndr	54.000.000	-	54.000.000	-	-	51.593.058	95,5%
<b>Total Carabineros de Chile</b>							<b>570.027.000</b>	<b>280.260.000</b>	<b>263.954.000</b>	<b>9.375.000</b>	<b>16.438.000</b>	<b>241.689.116</b>	<b>91,6%</b>
Comisión Nacional del Medio Ambiente	30073528	ANALISIS QUIMICO DE SUELO ZONA URBANA DE LA CIUDAD DE ARICA	Estudios Básicos (31.01)	Comunal (Arica)	Multisectorial	Fndr	16.070.000	5.170.000	10.900.000	-	-	10.900.000	100,0%
	30086592	ACTUALIZACION PRESENCIA DE METALES PESADOS EN EL SUELO, SUBSUELO Y EN EL AIRE POBLACION SECTOR LOS INDUSTRIALES, SITIO F, aRICA	Servicios Técnicos y Profesionales (22.11)	Regional	Salud	Fndr	60.264.000	-	22.964.000	37.300.000	-	22.964.000	100,0%
<b>Total Comisión Nacional del Medio Ambiente</b>							<b>76.334.000</b>	<b>5.170.000</b>	<b>33.864.000</b>	<b>37.300.000</b>	<b>-</b>	<b>33.864.000</b>	<b>100,0%</b>
Corporación Nacional Forestal	30071261	AMPLIACION CENTRO EDUCACION AMBIENTAL LAS MAITAS, ARICA	Proyectos (31.02)	Comunal (Arica)	Silvoagropecuario	Fndr	5.322.000	2.503.810	2.793.000	-	25.190	2.792.790	100,0%
	30073165	CONSTRUC. CENTRO INFORMACION AMBIENTAL PUTRE TRANSFERENCIA PRACTICAS AMBIENTALES CEA, LAS MAITAS	Proyectos (31.02) Programas De	Comunal (Putre)	Silvoagropecuario	Fndr	4.950.800	1.797.800	3.153.000	-	-	3.153.150	100,0%
	30073208	ARICA	Inversión (31.03)	Comunal (Arica)	Silvoagropecuario	Fndr	13.560.000	7.030.000	6.526.000	-	4.000	6.526.000	100,0%
<b>Total Corporación Nacional Forestal</b>							<b>23.832.800</b>	<b>11.331.610</b>	<b>12.472.000</b>	<b>-</b>	<b>29.190</b>	<b>12.471.940</b>	<b>100,0%</b>
Dirección de Arquitectura	20156990	CONSTRUCCION GIMNASIO C.R.E.E.- ARICA REPOSICION OFICINA REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION DE	Proyectos (31.02)	Comunal (Arica) Comunal	Justicia	Fndr	331.193.000	2.004.000	160.228.541	168.960.459	-	160.228.541	100,0%
	20179740	CODPA CONSTRUCCION JARDIN INFANTIL CON SALA CUNA, SECTOR	Proyectos (31.02)	Comunal (Camarones)	Justicia Educación y Cultura	Fndr	272.287.000	3.109.000	103.741.819	165.436.181	-	103.741.819	100,0%
	20181839	TACORA, ARICA CONSTRUCCION PARQUE RECREATIVO DEPORTIVO SECTOR	Proyectos (31.02)	Comunal (Arica)	Cultura	Fndr	676.638.000	1.800.000	65.807.234	609.030.766	-	65.807.234	100,0%
	20186045	LOS INDUSTRIALES, ARICA 2008 REPOSICION JARDIN INFANTIL SANTA ROSA CON	Proyectos (31.02)	Comunal (Arica)	Deportes Educación y Cultura	Fndr	957.405.000	1.500.000	-	955.905.000	-	-	#DIV/0!
	30004302	AMPLIACION A SALA CUNA, ARICA CONSTRUCCION OFICINA REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	Proyectos (31.02)	Comunal (Arica)	Cultura	Fndr	624.550.000	1.000.000	-	623.550.000	-	-	#DIV/0!
	30005642	ARICA CONSTRUCCION JARDIN INFANTIL CON SALA CUNA,	Proyectos (31.02)	Comunal (Arica)	Justicia Educación y Cultura	Fndr	219.175.000	170.452.000	36.723.000	12.000.000	-	28.800.000	78,4%
	30046467	CHINCHORRO ORIENTE, ARICA CONSTRUCCION DEPENDENCIAS CATEDRAL SAN MARCOS DE	Proyectos (31.02)	Comunal (Arica)	Cultura Educación y	Fndr	546.347.000	1.800.000	367.051.000	177.496.000	-	367.051.000	100,0%
	30062168	ARICA (DISEÑO) CONSTRUCCION MODULO SALA CUNA EN JARDIN INFANTIL	Proyectos (31.02)	Comunal (Arica)	Cultura Educación y	Fndr	19.740.000	1.090.000	7.460.000	11.190.000	-	7.460.000	100,0%
	30064923	PACHAMAMA (FUNDACION INTEGRAL)	Proyectos (31.02)	Comunal (Putre)	Cultura	Fndr	203.253.000	1.420.000	97.239.000	104.594.000	-	97.239.000	100,0%
	30065395	AMPLIACION EDIFICIO SERVICIO MEDICO LEGAL DE ARICA AMPLIACION EDIFICIO SERVICIO MEDICO LEGAL DE ARICA (EJECUCION)	Proyectos (31.02)	Comunal (Arica)	Justicia	Fndr	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
		CONSTRUCCION MODULO SALA CUNA Y SALA MULTIUSO	Proyectos (31.02)	Comunal (Arica)	Justicia Educación y	Fndr	356.091.000	-	71.563.542	284.527.458	-	71.563.542	100,0%
	30065612	J.INF CAMPANITA CONSTRUCCION MODULO SALA CUNA Y SLA MULTIUSO J.INF	Proyectos (31.02)	Comunal (Arica)	Cultura Educación y	Fndr	304.422.481	22.350.000	269.173.636	12.898.845	-	269.173.636	100,0%
	30065614	RAYITO DE SOL CONSTRUCCION MODULO SALA CUNA Y SLA MULTIUSO J.INF	Proyectos (31.02)	Comunal (Arica)	Cultura Educación y	Fndr	171.167.000	153.481.800	17.685.200	-	-	17.119.189	96,8%
	30066812	AVIONCITO CONSTRUCCION MODULO SALA CUNA Y SLA MULTIUSO J.INF	Proyectos (31.02)	Comunal (Arica)	Cultura Educación y	Fndr	166.428.000	148.742.800	17.685.200	-	-	17.119.189	96,8%
	30066813	DUMBO RESTAURACION IGLESIA DE MULLURI, CAMARONES	Proyectos (31.02)	Comunal (Arica) Comunal	Cultura Educación y	Fndr	296.256.000	1.500.000	281.857.154	12.898.846	-	281.856.446	100,0%
	30067308	PROVINCIA DE ARICA	Proyectos (31.02)	Comunal (Camarones)	Cultura	Fndr	13.430.000	13.430.000	-	-	-	-	#DIV/0!

Unidad Técnica	Código	Nombre de la Iniciativa	Item Presupuestario	Ubicación Geográfica	Sector	Fuente Financiamiento	Valores						
							Suma de Costo Ajustado	Suma de Gastado Años Anteriores	Suma de Solicitado	Suma de Saldo Próximos Año	Suma de Saldo Años Restantes	Suma de Inv. Ejecutada a Dic. 2009	Suma de Porcentaje Ejecución a Dic.
	30067319	RESTAURACION IGLESIA DE SAGUARA CAMARONES	Proyectos (31.02)	Comunal (Camarones)	Educación y Cultura	Fndr	13.430.000	13.430.000	-	-	-	-	#iDIV/0!
	30067320	RESTAURACION IGLESIA DE GUAÑACAGUA, CAMARONES	Proyectos (31.02)	Comunal (Camarones)	Educación y Cultura	Fndr	13.430.000	13.430.000	-	-	-	-	#iDIV/0!
	30067330	RESTAURACION IGLESIA DE TULAPALCA CAMARONES	Proyectos (31.02)	Comunal (Camarones)	Educación y Cultura	Fndr	13.430.000	13.430.000	-	-	-	-	#iDIV/0!
	30067333	RESTAURACION IGLESIA DE PARCOHAILLA, CAMARONES	Proyectos (31.02)	Comunal (Camarones)	Educación y Cultura	Fndr	13.430.000	13.430.000	-	-	-	-	#iDIV/0!
	30078773	REPOSICION EDIFICIO RESIDENCIAL HOGAR DEL NIÑO, ARICA	Proyectos (31.02)	Comunal (Arica)	Justicia	Fndr	36.255.000	600.000	26.310.000	9.345.000	-	26.310.000	100,0%
	30078793	AMPLIACION OFICINA REGIONAL JUNAEB, ARICA Y PARINACOTA	Proyectos (31.02)	Comunal (Arica)	Multisectorial	Fndr	12.882.000	702.000	1.150.000	11.030.000	-	1.150.000	100,0%
	30078811	REPOSICION EDIFICIO CENTRO ATENCION LACTANTE Y PREESCOLAR, ARICA	Proyectos (31.02)	Comunal (Arica)	Justicia	Fndr	35.555.000	600.000	25.785.000	9.170.000	-	25.785.000	100,0%
	30083908	RESTAURACION EDIFICIO MONUMENTO NACIONAL, EX ADUANA ARICA	Proyectos (31.02)	(en blanco)	Cultura	Fndr	19.213.000	-	1.000.000	18.213.000	-	1.000.000	100,0%
	30084588	REPOSICION SUBOFICINA CARDENAL SILVA HENRIQUEZ - SRCEI ARICA	Proyectos (31.02)	Regional	Justicia	Fndr	37.558.000	-	1.175.000	36.383.000	-	1.175.000	100,0%
	30084824	RESTAURACION MONUMENTO NACIONAL CATEDRAL SAN MARCOS DE ARICA	Proyectos (31.02)	Regional	Educación y Cultura	Fndr	23.530.000	-	1.000.000	22.530.000	-	1.000.000	100,0%
	30085580	CONSTRUCCION JARDIN INFANTIL CON SALA CUNA SECTOR EL ALTO, ARICA	Proyectos (31.02)	Regional	Educación y Cultura	Fndr	36.234.000	-	839.000	35.395.000	-	839.000	100,0%
	30086532	DIAGNOSTICO ESTRUCTURAL ESTADIO CARLOS DITTBORN DE ARICA	Proyectos (31.01)	Regional	Deportes	Fndr	23.379.000	-	23.379.000	-	-	23.379.000	100,0%
<b>Total Dirección de Arquitectura</b>							<b>5.436.708.481</b>	<b>579.301.600</b>	<b>1.576.853.326</b>	<b>3.280.553.555</b>	<b>-</b>	<b>1.567.797.596</b>	<b>99,4%</b>
Dirección de Obras Hidráulicas	20155044	CONSTRUCCION ESTANQUE LLUSCUMA, PUTRE	Proyectos (31.02)	Comunal (Putre)	Silvoagropecuario	Fndr	455.413.000	978.000	215.472.065	238.962.935	-	215.472.065	100,0%
	20155596	MEJORAMIENTO CANALES SECTOR ALFALFANE Y TAPI - UPUILLA TICNAMAR	Proyectos (31.02)	Comunal (Arica)	Silvoagropecuario	Fndr	79.750.000	79.750.000	-	-	-	-	#iDIV/0!
	30003715	MEJORAMIENTO CANAL CHACACAGUA POBLADO DE SOCOROMA, PUTRE	Proyectos (31.02)	Comunal (Putre)	Silvoagropecuario	Fndr	119.522.000	1.943.000	-	117.579.000	-	-	#iDIV/0!
	30034648	CONSTRUCCION EMBALSE LIVILCAR VALLE DE AZAPA, COMUNA DE ARICA	Proyectos (31.02)	Comunal (Arica)	Multisectorial	Fndr	1.600.000.000	-	-	1.200.000.000	400.000.000	-	#iDIV/0!
	30034830	CONSTRUCCION DEFENSAS FLUVIALES MATRIZ Y ATRAVIESO PAMPANUNI, COCHIZA, COMUNA DE CAMARONES	Proyectos (31.02)	Comunal (Camarones)	Multisectorial	Fndr	10.517.000	917.000	9.600.000	-	-	9.600.000	100,0%
	30070884	CONSTRUCCION PROTECCIONES DE PREDIOS AGRICOLAS CAUCE Q. VITOR.	Proyectos (31.02)	Comunal (Arica)	Multisectorial	Fndr	37.743.000	1.202.000	36.541.000	-	-	36.540.625	100,0%
<b>Total Dirección de Obras Hidráulicas</b>							<b>2.302.945.000</b>	<b>84.790.000</b>	<b>261.613.065</b>	<b>1.556.541.935</b>	<b>400.000.000</b>	<b>261.612.690</b>	<b>100,0%</b>
Dirección Obras Portuarias	30065797	CONSTRUCCION OBRAS DE RELOCALIZACION CALETA PESQUERA ARICA (PREFACT)	Proyectos (31.02)	Comunal (Arica)	Pesca	Fndr	87.111.000	307.000	23.438.000	63.366.000	-	23.437.000	100,0%
<b>Total Dirección Obras Portuarias</b>							<b>87.111.000</b>	<b>307.000</b>	<b>23.438.000</b>	<b>63.366.000</b>	<b>-</b>	<b>23.437.000</b>	<b>100,0%</b>
Dirección Vialidad	30080097	CONSERVACION PERIODICA RUTA 11-CH, Km 36 al 76	Proyectos (31.02)	Regional	Transporte	Fndr	4.729.590.576	1.109.582.045	3.620.008.531	-	-	3.555.087.986	98,2%
<b>Total Dirección Vialidad</b>							<b>4.729.590.576</b>	<b>1.109.582.045</b>	<b>3.620.008.531</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3.555.087.986</b>	<b>98,2%</b>
Fundación Integra	30083541	ADQUISICION BUS PARA TRANSPORTE ESCOLAR, GENERAL LAGOS	Adquisicion De Activos No Financieros (29)	Comunal (Gral Lagos)	Educación y Cultura	Fndr	23.169.819	22.450.000	719.819	-	-	719.819	100,0%
	30083548	ADQUISICION EQUIPAMIENTO COMPUTACIONAL JARDINES INFANTILES - INTEGRAL	Adquisicion De Activos No Financieros (29)	Comunal (Arica)	Educación y Cultura	Fndr	21.410.760	4.241.160	17.169.600	-	-	17.169.599	100,0%
<b>Total Fundación Integra</b>							<b>44.580.579</b>	<b>26.691.160</b>	<b>17.889.419</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>17.889.418</b>	<b>100,0%</b>
Gendarmería de Chile, Dirección Regional	30077726	CONSTRUCCION CENTRO DE REINSECCION SOCIAL DE ARICA	Proyectos (31.02)	Comunal (Arica)	Justicia	Fndr	27.500.000	500.000	8.450.000	-	18.550.000	8.450.000	100,0%
	30083298	REPOSICION EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD GENDARMERIA ARICA	Adquisicion De Activos No Financieros (29)	Comunal (Arica)	Defensa y Seguridad	Fndr	32.566.000	25.766.000	6.800.000	-	-	6.800.000	100,0%
<b>Total Gendarmería de Chile, Dirección Regional</b>							<b>60.066.000</b>	<b>26.266.000</b>	<b>15.250.000</b>	<b>-</b>	<b>18.550.000</b>	<b>15.250.000</b>	<b>100,0%</b>
Gobierno Regional	20157341	AMPLIACION MUSEO AZAPA- SALA DE EXHIBICION CULTURA CHINCHORR	Proyectos (31.02)	Comunal (Arica)	Educación y Cultura	Fndr	327.341.872	327.341.872	-	-	-	-	#iDIV/0!
	20190469	CONSTRUCCION ELECTRIFICACION SING COMUNA DE GENERAL LAGOS	Proyectos (31.02)	Comunal (Gral Lagos)	Energía	Fndr	870.586.000	340.199.667	530.470.333	-	84.000	460.824.437	86,9%
	30004142	CONST ELECTRIFICACION RURAL CHAPISCA-SORA.V.LLUTA ARICA	Proyectos (31.02)	Comunal (Arica)	Energía	Fndr	136.463.848	-	136.463.848	-	-	135.813.848	99,5%

Unidad Técnica	Código	Nombre de la Iniciativa	Item Presupuestario	Ubicación Geográfica	Sector	Fuente Financiamiento	Valores					Suma de Inv. Ejecutada a Dic. 2009	Suma de Porcentaje Ejecución a Dic.
							Suma de Costo Ajustado	Suma de Gastado Años Anteriores	Suma de Solicitado	Suma de Saldo Próximos Año	Suma de Saldo Años Restantes		
Gobierno Regional	30035869	CONSTRUCCION JARDIN INFANTIL SOMBRERITO EN ARICA REPOSICION POSTACION PUBLICA, ALCERRECA, TACORA,	Proyectos (31.02)	Comunal (Arica)	Educación y Cultura	Fndr	387.662.000	833.000	109.318.705	277.510.295	-	109.318.705	100,0%
	30062730	ANCOLACANE. REPOSICION BUS ESCOLAR, ESCUELAS COMUNA DE	Proyectos (31.02)	Lagos Comunal	Energía Educación y Cultura	Fndr	19.200.000	19.210.381	-	-	10.381	-	#¡DIV/0!
	30063815	CAMARONES RESTAURACION IGLESIA DE SOCOROMA, COMUNA DE	Proyectos (31.02) Transf. de Capital Al	Comunal (Camarones)	Educación y Cultura	Fndr	59.983.000	-	59.500.000	-	483.000	59.500.000	100,0%
	30067926	PUTRE RESTAURACION IGLESIA DE PARINACOTA, COMUHNA DE	Sector Privado (33.01) Transf. de Capital Al	Regional	Educación y Cultura	Fndr	20.485.000	-	20.432.000	53.000	-	20.432.000	100,0%
	30068486	PUTRE DIAGNOSTICO GENERACION ESTRATEGIA REG. DESARROLLO	Sector Privado (33.01) Estudios Básicos (31.01)	Regional	Educación y Cultura	Fndr	20.485.000	-	20.432.000	53.000	-	20.432.000	100,0%
	30074308	ARICA-PARINACOTA MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA ORGANIZACIONES	Proyectos (31.02)	Regional	Multisectorial	Fndr	61.136.000	36.000.000	25.136.000	-	-	-	0,0%
	30075903	SOCIALES DE ARICA Y PARINACOTA EQUIPAMIENTO ORGANIZACIONES SOCIALES DE ARICA Y	Proyectos (31.02)	Regional	Multisectorial	Fndr	163.119.338	66.354.436	96.764.902	-	-	96.764.902	100,0%
	30075905	PARINACOTA DIFUSION DE ACTIVIDADES DE INTERNACIONALIZACION DE	Proyectos (31.02) Programas De	Regional	Multisectorial	Fndr	104.772.043	77.040.858	27.731.185	-	-	27.831.185	100,4%
	30079365	ARICA Y PARIN	Inversión (31.03)	Regional	Multisectorial	Fndr	133.100.000	42.067.752	91.032.248	-	-	61.674.436	67,8%
	30079366	CONSTRUCCION EDIFICIO GORE ARICA Y PARINACOTA RESTAURACION MONUMENTO NACIONAL EX ISLA DEL	Proyectos (31.02)	Comunal (Arica)	Multisectorial Educación y Cultura	Fndr	48.484.000	-	-	48.484.000	-	-	#¡DIV/0!
	30084822	ALACRAN ADQUISICION DE EQUIPOS DE LA RED DE	Proyectos (31.02) Adquisicion De Activos	Regional	Cultura Defensa y Seguridad	Fndr	32.743.000	-	743.000	32.000.000	-	743.000	100,0%
	30085068	TELECOMUNICACIONES DE LA REGION DE AyP DIAGNOSTICO Y PLAN DE ACCION DEL CIRCUITO	No Financieros (29)	Regional	Seguridad	Fndr	86.778.026	-	86.778.026	-	-	60.075.456	69,2%
	30086010	PATRIMONIAL DE 30 IGLESIAS ANDINAS DE ARICA Y PARINACOTA	Transf. de Capital Al Sector Privado (33.01)	Regional	Educación y Cultura	Fndr	118.380.000	-	76.465.000	41.915.000	-	76.465.000	100,0%
	30086402	MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA ORGANIZACIONALES SOCIALES REGION ARICA Y PARINACOTA. ADQUISICION MOBILIARIO, EQUIPOS Y OTROS PARA ORG.	Proyectos (31.02) Adquisicion De Activos	Regional	Multisectorial	Fndr	249.976.000	-	249.976.000	-	-	119.777.092	47,9%
	30086480	SOCIALES XV REG	No Financieros (29) Adquisicion De Activos	Regional	Multisectorial	Fndr	121.749.460	-	121.749.460	-	-	84.099.992	69,1%
	30087827	ADQUISICION MAQ. LOKOMAT TELETON REGION XV REPOSICION EQUIPOS DE RESCATE PESADO, 1RA COMPAÑIA	No Financieros (29) Adquisicion De Activos	Regional	Salud Defensa y Seguridad	Fndr	339.130.000	-	339.130.000	-	-	236.268.354	69,7%
	30088253	BOMBEROS, ARICA ADQUISICION EDIFICIO EX - ESTACION FERROCARRIL ARICA	No Financieros (29) Adquisicion De Activos	Comunal (Arica)	Seguridad Educación y Cultura	Fndr	12.500.000	-	12.500.000	-	-	-	0,0%
	30091086	LA PAZ	No Financieros (29) Programas De	Regional	Cultura	Fndr	820.000.000	-	400.000.000	420.000.000	-	400.000.000	100,0%
	30092864	DIFUSION PROMULGACION PLAN REGULADOR DE ARICA REPOSICION GRUPO ELECTROGENO Y LUMINARIAS DE	Inversión (31.03) Transf. de Capital A	Provincial (Arica)	Multisectorial	Fndr	18.675.000	-	18.675.000	-	-	15.777.740	84,5%
	30092982	GUALLATIRE, COMUNA DE PUTRE REPOSICION TRANSFORMADOR Y LUMINARIAS DE	Otras Ent.Públicas Transf. de Capital A	Regional Provincial	Energía	Fndr	-	-	-	-	-	-	#¡DIV/0!
	30093015	EPISCACHA CONVENIO FIC - GORE - UNIVERSIDAD ARTURO PRAT PARA	Otras Ent.Públicas Transf. de Capital A	(Parinacota)	Energía	Fndr	-	-	-	-	-	-	#¡DIV/0!
(en blanco)		INVESTIGACION APLICADA 2009 -2010	Otras Ent.Públicas Transf. de Capital A	Regional	Pesca	Fndr	29.500.000	-	29.500.000	-	-	29.500.000	100,0%
		CONVENIO FIC DE TRANSFERENCIA A COMICION NACIONAL DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y TECNOLOGICA. CONVENIO TRANSFERENCIA FIC, GORE-FUNDACION PARA LA INNOVACION AGRARIA	Otras Ent.Públicas (33.03) Transf. de Capital Al Sector Privado (33.01)	Regional	Multisectorial	Fndr	352.949.000	-	352.949.000	-	-	352.949.000	100,0%
		FONDO CULTURAL 2% (PRIVADO)	Transf.Corrientes al Sector Privado (24.01)	Comunal (Arica)	Silvoagropecuario Educación y Cultura	Fndr	345.600.000	-	345.600.000	-	-	345.600.000	100,0%
		FONDO CULTURAL 2% (PUBLICO)	Transf.Corrientes a Otras Ent.Públicas Transf.Corrientes al Sector Privado (24.01)	Comunal (Arica)	Cultura Educación y Deportes	Fndr	98.787.000	-	98.787.000	-	-	191.056.298	193,4%
		FONDO DEPORTE 2% (PRIVADO)	Transf.Corrientes a Otras Ent.Públicas	Comunal (Arica)	Cultura	Fndr	98.787.000	-	98.787.000	-	-	102.787.000	104,0%
		FONDO DEPORTE 2% (PUBLICO)	Transf.Corrientes a Otras Ent.Públicas	Comunal (Arica)	Deportes	Fndr	195.197.000	-	195.197.000	-	-	194.084.280	99,4%
		PROGRAMA DE FOMENTO PRODUCTIVO, CIENTIFICO Y TECNOLOGICO PARA LA REGION DE ARICA Y PARINACOTA (INIA)	Transf. de Capital Al Sector Privado (33.01)	Comunal (Arica)	Deportes	Fndr	98.787.000	-	98.787.000	-	-	97.000.000	98,2%
			Transf. de Capital Al Sector Privado (33.01)	Regional	Silvoagropecuario	Fndr	1.519.035.000	326.687.000	320.593.000	871.755.000	-	170.000.000	53,0%

Unidad Técnica	Código	Nombre de la Iniciativa	Item Presupuestario	Ubicación Geográfica	Sector	Fuente Financiamiento	Valores							
							Suma de Costo Ajustado	Suma de Gastado Años Anteriores	Suma de Solicitado	Suma de Saldo Próximos Año	Suma de Saldo Años Restantes	Suma de Inv. Ejecutada a Dic. 2009	Suma de Porcentaje Ejecución a Dic.	
Gobierno Regional	(en blanco)	SERCOTEC PROGRAMA CAPITAL SEMILLA LINEA EMPRENDIMIENTO, REGION ARICA Y PARINACOTA	Transf. de Capital A Otras Ent.Públicas	Regional	Ind., Com., Fzas. y Turismo	Fndr	86.625.000	-	86.625.000	-	-	86.625.000	100,0%	
<b>Total Gobierno Regional</b>							<b>6.978.016.587</b>	<b>1.235.734.966</b>	<b>4.050.122.707</b>	<b>1.691.770.295</b>	<b>388.619</b>	<b>3.555.399.725</b>	<b>87,8%</b>	
I. Municipalidad de Arica		CONSTRUCCION CENTRO EXPERIMENTAL APRENDIZAJE			Educación y									
	20189120	LICEO POLITECNICO ARICA	Proyectos (31.02)	Comunal (Arica)	Cultura	Fndr	168.628.059	91.135.556	77.492.501	-	2	77.492.501	100,0%	
	30005429	REPOSICION VILLA ALBERGUE DE ARICA	Proyectos (31.02)	Comunal (Arica)	Multisectorial	Fndr	328.853.112	328.853.112	-	-	-	-	# DIV/0!	
	30037265	ADQUISICON UNIDAD DENTAL MOVIL PARA LA COMUNA DE ARICA	Adquisicion De Activos											
	30037265	ARICA	No Financieros (29)	Comunal (Arica)	Salud	Fndr	50.000.000	-	50.000.000	-	-	50.000.000	100,0%	
	30037469	REPOSICION SIST.RED.A.POT.RED ELECTRICA Y MEJOR SS.HH												
	30037469	SANTUARIO LAS PEÑAS	Proyectos (31.02)	Comunal (Arica)	Multisectorial	Fndr	185.765.691	-	183.396.000	24.066.891	-	21.697.200	127.206.080	69,4%
	30045421	CONSTRUCCION SEDE SOCIAL POBLACION GUAÑACAGUA III, U.V.Nº71 ARICA	Proyectos (31.02)	Comunal (Arica)	Multisectorial	Fndr	53.947.478	37.635.225	16.312.253	-	-	13.474.253	82,6%	
	30060275	MEJORAMIENTO POSTAS RURALES SOBRAYA Y POCONCHILE	Proyectos (31.02)	Comunal (Arica)	Salud	Fndr	259.412.000	550.000	40.017.000	-	218.845.000	-	0,0%	
	30060292	REPOSICION EQUIPAMIENTO MEDICO SERVICIO MUNICIPAL DE SALUD ARICA	Proyectos (31.02)	Comunal (Arica)	Salud	Fndr	41.284.686	14.545.386	26.739.300	-	-	26.739.300	100,0%	
	30061751	CONSTRUCCION ALUMBRADO PUBLICO PLAZAS ROTO	Proyectos (31.02)	Comunal (Arica)	Energía	Fndr	23.856.211	650.000	23.206.211	-	-	23.206.211	100,0%	
	30061752	CHILENO Y COLON	Proyectos (31.02)	Comunal (Arica)	Energía	Fndr	68.214.742	64.836.504	3.378.238	-	-	3.378.237	100,0%	
	30061752	CONSTRUCCION ALUMBRADO PUBLICO CAMINO ACCESO VEHIC. MORRO DE ARICA	Proyectos (31.02)	Comunal (Arica)	Energía Educación y	Fndr	68.214.742	64.836.504	3.378.238	-	-	3.378.237	100,0%	
	30063255	AMPLIACION ESCUELA RURAL BASICA SOBRAYA G-28, ARICA	Proyectos (31.02)	Comunal (Arica)	Cultura	Fndr	256.391.298	1.300.000	255.092.000	-	-	702	239.307.298	93,8%
	30071117	CONSTRUC. ALUMBRADO PUBLICO PLAYA CHINCHORRO NORTE ARICA	Proyectos (31.02)	Comunal (Arica)	Energía	Fndr	78.079.701	650.000	77.429.701	-	-	77.429.701	100,0%	
	30071117	NORMALIZACION EX - VERTEDERO QUEBRADA ENCANTADA												
	30071159	BAJA ARICA	Proyectos (31.02)	Comunal (Arica)	Multisectorial	Fndr	107.629.200	650.000	117.446.000	-	-	10.466.800	49.299.000	42,0%
	30073270	AMPLIACION CASA DEL ADULTO MAYOR,ARICA	Proyectos (31.02)	Comunal (Arica)	Multisectorial	Fndr	84.126.752	650.000	83.477.000	-	-	248	83.476.752	100,0%
	30073270	HABILITACION INFRAESTRUCTURA HUMEDAL												
	30073581	DESEMBOCADURA RIO LLUTA ARICA	Proyectos (31.02)	Comunal (Arica)	Multisectorial	Fndr	69.650.000	-	69.650.000	-	-	-	0,0%	
	30073581	REPOSICION JUEGOS INFANTILES BALNEARIO LA LISERA DE ARICA	Proyectos (31.02)	Comunal (Arica)	Multisectorial	Fndr	96.910.000	650.000	100.000.000	-	-	3.740.000	71.382.000	71,4%
	30074857	MEJORAMIENTO CIERROS PERIMETRALES ESCUELAS DE ARICA	Proyectos (31.02)	Comunal (Arica)	Educación y	Fndr	96.910.000	650.000	100.000.000	-	-	3.740.000	71.382.000	71,4%
	30075708	REPOSICION PAVIMENTOS 21 DE MAYO TRAMO COLON	Proyectos (31.02)	Comunal (Arica)	Cultura	Fndr	140.802.000	-	140.802.000	-	-	-	127.549.436	90,6%
	30077834	LYNCH, ARICA	Proyectos (31.02)	Comunal (Arica)	Multisectorial	Fndr	146.740.000	300.000	146.440.000	-	-	146.440.000	100,0%	
	30078145	MEJORAMIENTO PLAZA CRISTOBAL COLON, ARICA.	Proyectos (31.02)	Comunal (Arica)	Multisectorial	Fndr	788.693.000	-	300.000.000	488.693.000	-	-	646.000	0,2%
	30078145	MEJORAMIENTO PARQUE LAUCA TRAMO CHAPIQUIÑA-P.A												
	30078930	CERDA, ARICA.	Proyectos (31.02)	Comunal (Arica)	Multisectorial	Fndr	424.359.101	-	200.000.000	131.567.000	92.792.101	200.000.000	100,0%	
	30078930	REPOSICION CIERRE METÁLICO CANCHA ESTADIO CARLOS DITTBORN	Proyectos (31.02)	Comunal (Arica)	Deportes	Fndr	64.875.000	650.000	-	-	64.225.000	-	# DIV/0!	
	30080431	DITTBORN												
	30080552	REPOSICION PISTA REKORTAN ESTADIO CARLOS DITTBORN	Proyectos (31.02)	Comunal (Arica)	Deportes	Fndr	650.000	650.000	-	-	-	-	# DIV/0!	
	30080552	REPOSICION SERVICIOS HIGIENICOS Y CAMARINES ESTADIO CARLOS DITTBORN	Proyectos (31.02)	Comunal (Arica)	Deportes	Fndr	165.269.000	650.000	164.618.832	-	168	164.618.832	100,0%	
	30081140	MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA LICEO A-1, ARICA	Transf. de Capital A Otras Ent.Públicas	Comunal (Arica)	Deportes Educación y	Fndr	49.995.000	16.898.000	33.097.000	-	-	-	0,0%	
	30082461	MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA LICEO POLITECNICO A-2, ARICA	Transf. de Capital A Otras Ent.Públicas	Comunal (Arica)	Cultura Educación y	Fndr	49.995.000	16.898.000	33.097.000	-	-	-	0,0%	
	30082464	MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA LICEO B-4, ARICA	Transf. de Capital A Otras Ent.Públicas	Comunal (Arica)	Cultura Educación y	Fndr	49.995.000	16.898.000	33.097.000	-	-	-	0,0%	
	30082471	MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA LICEO COMERCIAL, ARICA	Transf. de Capital A Otras Ent.Públicas	Comunal (Arica)	Cultura Educación y	Fndr	49.995.000	16.898.000	33.097.000	-	-	-	0,0%	
	30082474	MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA LICEO PABLO NERUDA, ARICA	Transf. de Capital A Otras Ent.Públicas	Comunal (Arica)	Cultura Educación y	Fndr	49.995.000	16.898.000	33.097.000	-	-	-	0,0%	
	30082477	MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA LICEO PABLO NERUDA, ARICA	Transf. de Capital A Otras Ent.Públicas	Comunal (Arica)	Cultura Educación y	Fndr	49.995.000	16.898.000	33.097.000	-	-	-	0,0%	
	30082657	MEJORAMIENTO INTEGRAL LICEO AGRICOLA, ARICA	Transf. de Capital A Otras Ent.Públicas	Comunal (Arica)	Cultura	Fndr	49.528.000	24.013.672	25.514.328	-	-	25.063.832	98,2%	
	30088311	CONSTRUCCION GRADERIAS DE HORMIGON IN SITU- (ANDES)	Transf. de Capital A Otras Ent.Públicas	Comunal (Arica)	Deportes	Fndr	44.901.000	-	44.901.000	-	-	44.900.210	100,0%	
	30088328	CONSTRUCCION GRADERIAS DE HORMIGON IN- SITU (SUR)	Transf. de Capital A Otras Ent.Públicas	Comunal (Arica)	Deportes	Fndr	25.571.000	-	25.571.000	-	-	25.571.000	100,0%	

Unidad Técnica	Código	Nombre de la Iniciativa	Item Presupuestario	Ubicación Geográfica	Sector	Fuente Financiamiento	Valores						
							Suma de Costo Ajustado	Suma de Gastado Años Anteriores	Suma de Solicitado	Suma de Saldo Próximos Año	Suma de Saldo Años Restantes	Suma de Inv. Ejecutada a Dic. 2009	Suma de Porcentaje Ejecución a Dic.
I. Municipalidad de Arica	30088335	CONSTRUCCION GRADERIAS ESTRUCTURALES PACIFICO ANDES ESTADIO CARLOS D	Transf. de Capital A	Comunal (Arica)	Deportes	Fndr	47.624.000	-	45.998.688	-	1.625.312	45.998.688	100,0%
	30088359	CONSTRUCCION GRADERIAS ESTRUCTURALES (NORTE-SUR) ESTADIO CARLOS DITT	Otras Ent.Públicas Transf. de Capital A	Comunal (Arica)	Deportes	Fndr	35.334.000	-	34.403.025	-	930.975	34.403.025	100,0%
	30088369	REPOSICION CANCHA ESTADIO CARLOS DITTBORN, ARICA	Proyectos (31.02) Transf. de Capital A	Comunal (Arica)	Deportes	Fndr	74.307.000	-	71.394.972	-	2.912.028	44.285.132	62,0%
	30093853	MEJORAMIENTO S.S.H.H. Y CAMARINES ESC. E-15 SERME	Otras Ent.Públicas Transf. de Capital A	Comunal (Arica)	Educación y Cultura	Fndr	33.392.649	-	33.392.649	-	-	-	0,0%
	30093865	MEJORAMIENTO S.S.H.H. Y CAMARINES ESC. E-1 Y E-26 SERME	Otras Ent.Públicas Transf. de Capital A	Comunal (Arica)	Educación y Cultura	Fndr	44.484.299	-	44.484.299	-	-	30.787.509	69,2%
	30093867	MEJORAMIENTO S.S.H.H. Y CAMARINES ESC. D-21 Y D-91 SERME	Otras Ent.Públicas Transf. de Capital A	Comunal (Arica)	Educación y Cultura	Fndr	39.975.264	-	39.975.264	-	-	-	0,0%
	30093879	MEJORAMIENTO S.S.H.H. Y CAMARINES ESC. D-17 Y D-18 SERME	Otras Ent.Públicas Transf. de Capital A	Comunal (Arica)	Educación y Cultura	Fndr	40.139.232	-	40.139.232	-	-	-	0,0%
	30093889	MEJORAMIENTO S.S.H.H. Y CAMARINES ESC. G-27 Y D-23 SERME	Otras Ent.Públicas Transf. de Capital A	Comunal (Arica)	Educación y Cultura	Fndr	42.584.040	-	42.584.040	-	-	4.216.241	9,9%
	30093932	MEJORAMIENTO S.S.H.H. Y CAMARINES ESC. D-14 Y E-5 SERME	Otras Ent.Públicas Transf. de Capital A	Comunal (Arica)	Educación y Cultura	Fndr	49.968.302	-	49.968.302	-	-	-	0,0%
	30093933	MEJORAMIENTO SERVICIOS COCINAS ESC. D-24, D-21. LICEO COMERCIAL Y A-5, SERME	Otras Ent.Públicas Transf. de Capital A	Comunal (Arica)	Educación y Cultura	Fndr	36.895.278	-	36.895.278	-	-	-	0,0%
30093934	MEJORAMIENTO SERVICIOS COCINAS ESC. E-26, D-18. LICEO A-1, A-2 Y B-4, SERME	Otras Ent.Públicas Transf. de Capital A	Comunal (Arica)	Educación y Cultura	Fndr	34.444.868	-	34.444.868	-	-	-	0,0%	
30096883	MEJORAMIENTO Y PINTADO DE MUROS PERIM.SOLERAS INT.ESTADIO C.DITTBORN	Otras Ent.Públicas	Regional	Multisectorial	Fndr	40.950.000	-	-	40.950.000	-	27.300.000	#iDIV/0!	
<b>Total I. Municipalidad de Arica</b>							<b>4.494.210.963</b>	<b>652.859.455</b>	<b>2.810.648.981</b>	<b>685.276.891</b>	<b>345.425.636</b>	<b>1.764.171.238</b>	<b>62,8%</b>
I. Municipalidad de Camarones	20156373	MEJORAMIENTO PLAZA DE LA LOCALIDAD DE CODPA COMUNA DE CAMARONES	Proyectos (31.02) Estudios Básicos	Comunal (Camarones)	Multisectorial	Fndr	52.932.233	50.333.000	2.599.233	-	-	2.201.133	84,7%
	20191628	LEVANTAMIENTO DE INSTRUMENTO PLAN REGULADOR COMUNAL, COM. CAMARONES	(31.01)	Comunal (Camarones)	Multisectorial	Fndr	800.000	-	-	-	800.000	-	#iDIV/0!
	30059334	REPOSICION SALA MULTIPROPOSITO LOC. ESQUIÑA	Proyectos (31.02) Transf. de Capital A	Comunal (Camarones)	Multisectorial	Fndr	51.558.000	-	50.958.000	-	600.000	3.788.400	7,4%
	30059335	Construccion Sede Social de Timar	Otras Ent.Públicas	Comunal (Camarones)	Multisectorial	Fndr	49.000.000	-	14.860.000	34.140.000	-	-	0,0%
	30071857	REPOSICION SALA MULTIPROPOSITO LOC. GUAÑACAGUA	Proyectos (31.02) Transf. de Capital A	Comunal (Camarones)	Multisectorial	Fndr	80.653.000	25.876.000	52.950.283	-	1.826.717	52.950.283	100,0%
	30082010	CONSTRUCCION PAVIMENTACION LOCALIDAD DE CODPA Y GUAÑACAGUA	Otras Ent.Públicas Transf. de Capital A	Regional	Multisectorial Agua Potable y Alcantarillado	Fndr	49.481.920	-	2.474.096	-	47.007.824	2.474.096	100,0%
	30082012	CONSTRUCCION PAVIMENTACION DE TIMAR Y PACHICA MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO PUBLICO,	Otras Ent.Públicas	Regional Comunal	Alcantarillado	Fndr	49.467.909	-	2.473.396	-	46.994.513	2.473.396	100,0%
	30082013	LOCALIDAD DE CUYA Y COBIA REPARACIONES MULTICANCHAS LOC. ESQUIÑA,	Proyectos (31.02)	Comunal (Camarones)	Salud	Fndr	49.000.000	-	49.000.000	-	-	-	0,0%
	30082023	CAMARONES Y CODPA CONSTRUCCION PASARELAS PEATONALES, VALLE DE CODPA,	Proyectos (31.02) Transf. de Capital A	Comunal (Camarones)	Multisectorial	Fndr	48.500.000	-	48.500.000	-	-	-	0,0%
	30082024	COMUNA DE CAMARONES MEJORAMIENTO RED DIST. PUBLICA LOCALIDADES	Otras Ent.Públicas Transf. de Capital A	Comunal (Camarones)	Multisectorial	Fndr	48.000.000	-	48.000.000	-	-	18.103.000	37,7%
30082026	COMUNA DE CAMARONES INSTALACION LUMINARIAS FOTOVOLTAICAS PLAZA LOC. DE	Otras Ent.Públicas	Comunal (Camarones)	Multisectorial	Fndr	50.000.000	-	50.000.000	-	-	15.556.000	31,1%	
30082027	CAMARONES ADQUISICION NOTEBOOKS PARA ESCUELAS COMUNA DE	Proyectos (31.02) Adquisicion De Activos	Comunal (Camarones)	Energía Educación y Cultura	Fndr	49.980.000	-	49.980.000	-	-	-	0,0%	
30093296	CAMARONES	No Financieros (29)	Regional	Cultura	Fndr	30.000.000	-	30.000.000	-	-	29.921.468	99,7%	
<b>Total I. Municipalidad de Camarones</b>							<b>609.373.062</b>	<b>76.209.000</b>	<b>401.795.008</b>	<b>34.140.000</b>	<b>97.229.054</b>	<b>127.467.776</b>	<b>31,7%</b>
I. Municipalidad de Gral Lagos	30008387	CONSTRUCCION SALA MULTIUSO ANCOLACANE	Proyectos (31.02)	Comunal (Gral Comunal (Gral	Multisectorial	Fndr	41.291.073	38.510.558	2.780.515	-	-	538.516	19,4%
	30059925	CONSTRUCCION SALON DE EVENTOS, VISVIRI, COMUNA DE GENERAL LAGOS.	Proyectos (31.02)	Comunal (Gral Lagos)	Multisectorial	Fndr	120.043.850	83.273.901	36.769.949	-	-	-	0,0%
	30061013	REPOSICION PLAZA PUBLICA DE VISVIRI, COMUNA DE GENERAL LAGOS	Proyectos (31.02) Estudios Básicos	Comunal (Gral Lagos)	Multisectorial	Fndr	94.972.825	83.982.384	10.990.441	-	-	514.812	4,7%
	30062702	DIAGNOSTICO MULTISECTORIAL DEL DESARROLLO PRODUCTIVO EN GENERAL LAGOS	Estudios Básicos (31.01)	Comunal (Gral Lagos)	Multisectorial	Fndr	24.604.000	22.800.000	1.804.000	-	-	1.042.000	57,8%

Unidad Técnica	Código	Nombre de la Iniciativa	Item Presupuestario	Ubicación Geográfica	Sector	Fuente Financiamiento	Valores							
							Suma de Costo Ajustado	Suma de Gastado Años Anteriores	Suma de Solicitado	Suma de Saldo Próximos Año	Suma de Saldo Años Restantes	Suma de Inv. Ejecutada a Dic. 2009	Suma de Porcentaje Ejecución a Dic.	
I. Municipalidad de Gral Lagos	30062780	CONSTRUCCION BAÑO PUBLICO GUACOYO, COM.GRAL.LAGOS	Proyectos (31.02)	Comunal (Gral Lagos)	Multisectorial	Fndr	21.364.000	19.780.000	1.584.000	-	-	-	0,0%	
	30068311	REPOSICION PARARRAYOS LOCALIDADES COMUNA DE GRAL LAGOS	Proyectos (31.02)	Comunal (Gral Lagos)	Seguridad	Fndr	96.337.800	91.276.332	5.061.468	-	-	3.471.468	68,6%	
	30073479	REPOSICION Y AMPLIACION SISTEMAS FOTOVOLTAICOS, ESTANCIAS GRAL LAGOS	Proyectos (31.02)	Comunal (Gral Lagos)	Energía	Fndr	48.007.000	46.331.000	1.676.000	-	-	-	0,0%	
	30081710	CONSTRUCCION CORRALES TECHADOS Y BAÑOS ANTISARNICOS, LOCALIDADES COMUNA DE GENERAL LAGOS	Transf. de Capital A (33.03)	Comunal (Gral Lagos)	Salud	Fndr	49.762.000	-	49.762.000	-	-	34.035.710	68,4%	
	30081715	CONSTRUCCION GIMNASIO TECHADO, POBLADO DE CHUJLLUTA, COMUNA DE GENERAL LAGOS	Transf. de Capital A	Comunal (Gral Lagos)	Multisectorial	Fndr	50.000.000	-	50.000.000	-	-	45.886.558	91,8%	
	30081716	REPARACION GIMNASIO TECHADO, POBLADO DE VISVIRI, COMUNA DE GENERAL LAGOS	Transf. de Capital A	Comunal (Gral Lagos)	Multisectorial	Fndr	50.000.000	-	50.000.000	-	-	49.975.000	100,0%	
	30081717	ENERGIA ELÉCTRICA POBLADO DE CHAPUMA, COMUNA DE GENERAL LAGOS	Transf. de Capital A	Comunal (Gral Lagos)	Energía	Fndr	47.462.000	-	47.462.000	-	-	47.445.300	100,0%	
	30081721	AMPLIACION BIBLIOTECA DE VISVIRI, COMUNA DE GENERAL LAGOS	Transf. de Capital A	Comunal (Gral Lagos)	Educación y Cultura	Fndr	49.950.000	-	49.950.000	-	-	49.900.000	99,9%	
	30086261	REPOSICION CAMION TOLVA CARROCERIA BAJA, CON BARANDAS PARA LA COMUNA DE GENERAL LAGOS	Adquisicion De Activos No Financieros (29)	Comunal (Gral Lagos)	Multisectorial	Fndr	40.862.000	-	40.862.000	-	-	39.762.112	97,3%	
	30086264	REPOSICION CAMION ALJIBE PARA LA COMUNA DE GENERAL LAGOS	Adquisicion De Activos No Financieros (29)	Comunal (Gral Lagos)	Multisectorial	Fndr	45.618.000	-	45.618.000	-	-	44.791.124	98,2%	
<b>Total I. Municipalidad de Gral Lagos</b>							<b>780.274.548</b>	<b>385.954.175</b>	<b>394.320.373</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>317.362.600</b>	<b>80,5%</b>	
I. Municipalidad de Putre	30036950	AMPLIACION INTERNADO ESCUELA E 43, TICNAMAR, COMUNA DE PUTRE	Proyectos (31.02)	Comunal (Putre)	Educación y Cultura	Fndr	118.416.200	105.482.200	12.934.000	-	-	-	0,0%	
	30037209	CONSTRUCCION SALA APOYO TECNICOPEADAGOGICO, LICEO C-3, PUTRE, I REG.	Proyectos (31.02)	Comunal (Putre)	Educación y Cultura	Fndr	27.603.850	21.747.850	5.856.000	-	-	-	0,0%	
	30062390	AMPLIACION INTERNADO LICEO C-3, COMUNA DE PUTRE	Proyectos (31.02)	Comunal (Putre)	Educación y Cultura	Fndr	205.340.550	61.627.520	143.713.030	-	-	134.623.729	93,7%	
	30062393	CONSTRUCCION TECHADO DE PATIO ESCUELA E-43 TICNAMAR	Proyectos (31.02)	Comunal (Putre)	Educación y Cultura	Fndr	35.709.000	15.354.645	20.354.355	-	-	20.354.355	100,0%	
	30065041	CONSTRUCCION TECHADO DE PATIO ESC G-44 DE BELEN, PUTRE	Proyectos (31.02)	Comunal (Putre)	Educación y Cultura	Fndr	43.315.268	32.496.044	10.819.224	-	-	10.819.224	100,0%	
	30065057	CONSTRUCCION TECHADO DE PATIO ESC.G-39 SOCOROMA	Proyectos (31.02)	Comunal (Putre)	Cultura	Fndr	34.942.000	13.664.800	21.277.200	-	-	21.277.200	100,0%	
	30080282	CONSTRUCCION JUZGADO POLICIAL LOCAL, COMUNA DE PUTRE	Proyectos (31.02)	Comunal (Putre)	Justicia	Fndr	-	-	12.400.000	-	12.400.000	539.000	4,3%	
30092127	Reposición sistemas de radiocomunicacion de Socoroma, Ticnamar, Saxamar y Chucuyo Comuna de Putre	Transf. de Capital A (33.03)	Otras Ent.Públicas	Regional	Comunicaciones	Fndr	-	-	-	-	-	-	#jDIV/0!	
<b>Total I. Municipalidad de Putre</b>							<b>465.326.868</b>	<b>250.373.059</b>	<b>227.353.809</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>12.400.000</b>	<b>187.613.508</b>	<b>82,5%</b>
Instituto Nacional del Deporte	30089182	ADQUISICION INFRAESTRUCTURA CAMPEONATO MUNDIAL DE SURF ARICA PRO CH	Adquisicion De Activos No Financieros (29)	Regional	Deportes	Fndr	37.710.036	-	37.710.036	-	-	37.710.036	100,0%	
<b>Total Instituto Nacional del Deporte</b>							<b>37.710.036</b>	<b>-</b>	<b>37.710.036</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>37.710.036</b>	<b>100,0%</b>	
Junta Nacional de Jardines Infantiles	20119780	EQUIPAMIENTO BIBLIOTECA DE AULA A NIVEL PREESCOLAR JUNJI ARICA	Adquisicion De Activos No Financieros (29)	Regional	Educación y Cultura	Fndr	92.982.000	-	92.982.000	-	-	92.419.830	99,4%	
	30082665	CONSERVACION DE 14 JARDINES INFANTILES JUNJI, ARICA	Proyectos (31.02)	Comunal (Arica)	Educación y Cultura	Fndr	64.444.803	-	64.444.803	-	-	64.444.803	100,0%	
<b>Total Junta Nacional de Jardines Infantiles</b>							<b>157.426.803</b>	<b>-</b>	<b>157.426.803</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>156.864.633</b>	<b>99,6%</b>	
Policia de Investigaciones	30064460	EQUIPAMIENTO UNIDAD ANTINARCOTICOS PICH CHACALLUTA, ARICA	Proyectos (31.02)	Comunal (Arica)	Defensa y Seguridad	Fndr	52.474.000	43.690.723	6.382.000	-	2.401.277	-	0,0%	
	30072411	REPOSICION CUARTEL BELEN, POLICIA DE INVESTIGACIONES DE ARICA, XV REGION	Proyectos (31.02)	Comunal (Arica)	Defensa y Seguridad	Fndr	77.803.000	903.000	30.760.000	46.140.000	-	30.760.000	100,0%	
<b>Total Policia de Investigaciones</b>							<b>130.277.000</b>	<b>44.593.723</b>	<b>37.142.000</b>	<b>46.140.000</b>	<b>2.401.277</b>	<b>30.760.000</b>	<b>82,8%</b>	
Seremi de Salud	30086606	CONTROL VECTORES INTERES SANITARIO SECTORES VULNERABLES ARICA	Programas De Inversión (31.03)	Regional	Salud	Fndr	-	-	650.000	-	650.000	650.000	100,0%	
<b>Total Seremi de Salud</b>							<b>-</b>	<b>-</b>	<b>650.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>650.000</b>	<b>650.000</b>	<b>100,0%</b>
Seremi de Vivienda y Urbanismo	20177869	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION EJE JUAN ANTONIO RIOS I.ETAPA, ARICA	Proyectos (31.02)	Comunal (Arica)	Transporte	Fndr	36.480.000	1.100.000	35.380.000	-	-	10.614.000	30,0%	
	20177880	MEJORAMIENTO NUDO TUCAPEL - LUIS VALENTE Y EMPALMES, ARICA	Proyectos (31.02)	Comunal (Arica)	Transporte	Fndr	68.613.300	1.200.000	67.413.300	-	-	40.447.980	60,0%	

Unidad Técnica	Código	Nombre de la Iniciativa	Item Presupuestario	Ubicación Geográfica	Sector	Fuente Financiamiento	Valores						
							Suma de Costo Ajustado	Suma de Gastado Años Anteriores	Suma de Solicitado	Suma de Saldo Próximos Año	Suma de Saldo Años Restantes	Suma de Inv. Ejecutada a Dic. 2009	Suma de Porcentaje Ejecución a Dic.
Seremi de Vivienda y Urbanismo	30003322	CONSTRUCCION PUENTE LAS ACACIAS Y VIAS DE EMPALME, ARICA	Proyectos (31.02)	Comunal (Arica)	Transporte	Fndr	42.876.000	30.404.000	12.472.000	-	-	-	0,0%
	30061246	REPOSICION ACERAS Y SOLERAS, DISTINTOS SECTORES DE ARICA	Proyectos (31.02)	Comunal (Arica)	Transporte	Fndr	952.844.000	680.000	509.618.202	441.440.798	1.105.000	509.618.202	100,0%
	30070202	CONSERVACION VIAS URBANAS AÑO 2008, ARICA	Proyectos (31.02)	Comunal (Arica)	Transporte	Fndr	2.362.567.000	2.306.168.000	54.896.756	-	1.502.244	54.896.756	100,0%
	30079381	CONSTRUCCION REDES BASICAS AGUA POTABLE SECC. CERRO CHUÑO, ARICA	Proyectos (31.02)	Comunal (Arica)	Alcantarillado Agua Potable y	Fndr	337.589.941	300.000	337.289.941	-	-	327.289.941	97,0%
	30079382	CONSTRUCCION RED BASICA ALCANTARILLADO SECC. CERRO CHUÑO, ARICA	Proyectos (31.02)	Comunal (Arica)	Alcantarillado	Fndr	395.436.580	300.000	395.136.580	-	-	386.136.579	97,7%
	30084135	CONSERVACION PAVIMENTOS AV. CDTE. SAN MARTIN (IGNACIO DE LOYOLA-LIMITE URBANO)	Proyectos (31.02)	Comunal (Arica)	Transporte	Fndr	182.106.456	-	182.106.456	-	-	182.106.456	100,0%
	30085201	ESTUDIOS BÁSICOS DIAGNOSTICO ESTRUCTURAL Y GEOTECNICO VIVIENDAS	Estudios Básicos (31.01)	Comunal (Arica)	Vivienda	Fndr	131.076.000	-	33.486.000	-	97.590.000	1.743.000	5,2%
	30086328	REPOSICION PARQUE CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO, ARICA	Proyectos (31.02)	Regional	Multisectorial	Fndr	1.300.913.000	-	831.377.000	463.536.000	6.000.000	775.166.079	93,2%
<b>Total Seremi de Vivienda y Urbanismo</b>							<b>5.810.502.277</b>	<b>2.340.152.000</b>	<b>2.459.176.235</b>	<b>904.976.798</b>	<b>106.197.244</b>	<b>2.288.018.993</b>	<b>93,0%</b>
Servicio de Salud	30047599	NORMALIZACION HOSPITAL ARICA- COMPONENTE EQUIPAMIENTO	Proyectos (31.02)	Comunal (Arica)	Salud	Fndr	350.000.000	-	350.000.000	-	-	301.242.108	86,1%
	30079146	CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD FAMILIAR SECTOR SUR, COMUNA DE ARICA	Proyectos (31.02)	Comunal (Arica) Comunal	Salud	Fndr	29.339.000	-	29.339.000	-	-	16.112.300	54,9%
	30079149	REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL DE CODPA, CUMUNA DE CAMARONES	Proyectos (31.02)	(Camarones) Comunal (Gral	Salud	Fndr	130.170.104	-	103.675.026	14.332.078	12.163.000	54.239.162	52,3%
	30083451	CONSERVACION POSTAS DE SALUD RURAL COMUNA DE GENERAL LAGOS	Proyectos (31.02)	Lagos)	Salud	Fndr	103.086.136	-	101.086.136	-	2.000.000	59.668.124	59,0%
	30084044	CONSERVACION POSTA DE SALUD RURAL DE TICNAMAR, COMUNA DE PUTRE	Proyectos (31.02)	Comunal (Putre)	Salud	Fndr	57.190.864	-	56.190.864	-	1.000.000	39.605.663	70,5%
<b>Total Servicio de Salud</b>							<b>669.786.104</b>	<b>-</b>	<b>640.291.026</b>	<b>14.332.078</b>	<b>15.163.000</b>	<b>470.867.357</b>	<b>73,5%</b>
Servicio de Vivienda y Urbanización	30003711	NORMALIZACION Y MEJORAMIENTO PREFIL MAIPU-18 SEPT. Y CONEXIONES	Proyectos (31.02)	Comunal (Arica)	Transporte	Fndr	16.447.859	-	1.455.000	-	14.992.859	-	0,0%
	30080194	CONSTRUCCION REDES BASICAS DE ALCANTARILLADO PAMPA NUEVA	Proyectos (31.02)	Regional	Alcantarillado Agua Potable y	Fndr	222.642.000	-	-	222.642.000	-	-	#¡DIV/0!
	30080196	CONSTRUCCION REDES BASICAS DE AGUA POTABLE, SECTOR PAMPA NUEVA	Proyectos (31.02)	Regional	Alcantarillado	Fndr	171.500.000	-	-	171.500.000	-	-	#¡DIV/0!
<b>Total Servicio de Vivienda y Urbanización</b>							<b>410.589.859</b>	<b>-</b>	<b>1.455.000</b>	<b>394.142.000</b>	<b>14.992.859</b>	<b>-</b>	<b>0,0%</b>
Servicio Nacional de Aduanas	30077716	AMPLIACION EDIF. ALBORADA PARA SERV. MINISTERIO HACIENDA EN ARICA	Proyectos (31.02)	Regional	Multisectorial	Fndr	86.007.000	-	432.000	85.575.000	-	432.000	100,0%
<b>Total Servicio Nacional de Aduanas</b>							<b>86.007.000</b>	<b>-</b>	<b>432.000</b>	<b>85.575.000</b>	<b>-</b>	<b>432.000</b>	<b>100,0%</b>
Servicio Nacional de Menores	30086005	ADQUISICION CONTAINER PARA GABINETE DE SEGURIDAD SENAME	Adquisicion De Activos No Financieros (29)	Regional	Justicia	Fndr	2.945.800	-	2.945.800	-	-	2.945.800	100,0%
<b>Total Servicio Nacional de Menores</b>							<b>2.945.800</b>	<b>-</b>	<b>2.945.800</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2.945.800</b>	<b>100,0%</b>
Servicio Nacional de Turismo	30069347	DIFUSION Y POSICIONAMIENTO DEL DESTINO ARICA PARINACOTA	Programas De Inversión (31.03)	Regional	Ind., Com., Fzas. y Turismo	Fndr	387.817.000	7.346.000	298.060.000	82.411.000	-	162.407.344	54,5%
	(en blanco)	Programa Fomento al Turismo BID-Sernatur	Adquisicion De Activos No Financieros Otros Activos No Financieros	Comunal (Putre)	Ind., Com., Fzas. y Turismo	Fndr	241.000.000	-	241.000.000	-	-	-	0,0%
<b>Total Servicio Nacional de Turismo</b>							<b>628.817.000</b>	<b>7.346.000</b>	<b>539.060.000</b>	<b>82.411.000</b>	<b>-</b>	<b>162.407.344</b>	<b>30,1%</b>
Subsecretaría de Desarrollo Regional	30084739	CONSTRUCCION MUSEO Y CENTRO DE CONSERVACION DE SAN MIGUEL DE AZAPA.	Proyectos (31.02)	Comunal (Arica)	Educación y Cultura	Fndr	363.958.000	-	12.800.000	351.158.000	-	12.800.000	100,0%
<b>Total Subsecretaría de Desarrollo Regional</b>							<b>363.958.000</b>	<b>-</b>	<b>12.800.000</b>	<b>351.158.000</b>	<b>-</b>	<b>12.800.000</b>	<b>100,0%</b>
Subsecretaría de Trabajo	(en blanco)	PROGRAMA GENERACION EMPLEO TRIM. ENE-MAR, ABRIL-JUNIO 2009	Transf. de Capital al Gobierno Central	Comunal (Arica)	Multisectorial	Fndr	846.258.000	-	846.258.000	-	-	846.258.000	100,0%
<b>Total Subsecretaría de Trabajo</b>							<b>846.258.000</b>	<b>-</b>	<b>846.258.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>846.258.000</b>	<b>100,0%</b>
Universidad de Tarapacá	30045547	REPOSICION COMPLEJO DPTV RECREACIONAL INTEGRAL - UTA, REGION XV	Proyectos (31.02)	Comunal (Arica)	Deportes	Fndr	1.200.419.000	-	-	-	1.200.419.000	-	#¡DIV/0!
	30071225	HABILITACION SECTOR DE EMPLAZAMIENTO MUSEO DE SITIO COLON 10, ARICA	Proyectos (31.02)	Comunal (Arica)	Educación y Cultura	Fndr	170.931.630	41.963.278	128.968.352	-	-	128.398.353	99,6%
<b>Total Universidad de Tarapacá</b>							<b>1.371.350.630</b>	<b>41.963.278</b>	<b>128.968.352</b>	<b>-</b>	<b>1.200.419.000</b>	<b>128.398.353</b>	<b>99,6%</b>
<b>Total general</b>							<b>37.174.025.973</b>	<b>7.158.885.071</b>	<b>18.573.898.471</b>	<b>9.237.058.552</b>	<b>2.204.183.879</b>	<b>15.819.227.109</b>	<b>85,2%</b>
